

# Voortgangsrapportage Regionale samenwerkingsagenda



Ons kenmerk: 17.0010653  
Versie: 2  
Datum: 19-09-2017  
Contactpersoon: Hans Uneken  
E-mail: [h.uneken@regiogv.nl](mailto:h.uneken@regiogv.nl)

## **INHOUD**

---

<b>Voorwoord</b>	<b>3</b>
<b>1. Kopprogramma</b>	<b>4</b>
<b>2. Programma Economie &amp; Arbeidsmarkt</b>	<b>7</b>
<b>3. Programma Wonen, Vastgoed &amp; Leegstand</b>	<b>12</b>
<b>4. Programma Ruimte &amp; Mobiliteit</b>	<b>14</b>
<b>5. Programma Cultuur &amp; Erfgoed, Recreatie &amp; Toerisme</b>	<b>17</b>
<b>6. Programma Jeugd &amp; Onderwijs</b>	<b>22</b>
<b>7. Programma Bescherming &amp; Opvang</b>	<b>24</b>
<b>8. Programma Milieu &amp; Duurzaamheid</b>	<b>30</b>
<b>9. Programma Dienstverlening</b>	<b>34</b>
<b>Financieel</b>	<b>41</b>

## Voorwoord

Geacht college,

Met trots bied ik u deze voortgangsrapportage aan. Hiermee koppelen we terug hoe het ervoor staat met de afspraken die in de Regionale samenwerkingsagenda zijn gemaakt. Wat verloopt er volgens plan, of waar moet in de komende periode nog een tandje bij? En ook: waar staan we financieel?

Zeker is dat er hard gewerkt wordt om de concrete doelen en projecten gestalte te geven. Graag geven we inzage in hoe ver we gevorderd zijn. Omdat de raadsleden in de regiogemeenten de eigenaar van de samenwerkingsagenda zijn, verzoek ik u om de voortgangsrapportage met hen te delen. Indien gewenst kunnen we in uw raad langskomen om een nadere toelichting te geven.

Op veel fronten leveren we met elkaar een bijdrage aan de gezondheid, het welzijn, de economie, de bereikbaarheid, de natuur en de vitaliteit van de inwoners in onze streek; voor inwoners, met gemeenten. U kunt erop rekenen dat we de intergemeentelijke samenwerking met vaart voortzetten.

Met vriendelijke groet,



Igor Meuwese  
Algemeen directeur Regio Gooi en Vechtstreek

## 1. Kopprogramma

<b>Project 1: Een versterkte informatiepositie van inwoners en gemeenten</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.</li> <li>2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.</li> <li>3. Gezonde en vitale regio.</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inwoners hebben toegang tot het digitaal leefplein en zijn meer in staat om zelf te sturen op gezondheid, welzijn en participatie.</li> <li>2. Inwoners zijn in staat om het effect van ingezette zorg en ondersteuning aan te geven.</li> <li>3. Inwoners zijn in staat om de dienstverlening van gemeenten en aanbieders te waarderen.</li> <li>4. Een beter toezicht op naleving van contractafspraken door marktpartijen via het regionaal contractbeheer.</li> <li>5. Een doelmatiger inzet van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inwoners hebben beveiligde toegang tot de informatie uit het digitaal leefplein via een persoonlijke pagina. Ze hebben daardoor o.a. inzicht in: welke zorg en ondersteuning aan hen is toegekend, hoeveel, en welke aanbieder de zorg of ondersteuning levert.</li> <li>2. Het inwonerportaal is ontwikkeld en opgeleverd in combinatie met de vergelijkingsite KiesZO. Via kieszo.nl kunnen inwoners de regionaal gecontracteerde zorgaanbieders onderling vergelijken en waarderen.</li> <li>3. Tergooi ziekenhuis en Jeugd en Gezin hebben besloten hun cliënt- en patiëntinformatie via het inwonerportaal te ontsluiten. Hierdoor kan de inwoner sneller schakelen tussen verschillende aanbieders van zorg en ondersteuning.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De lancering van het inwonerportaal/KiesZO is op 28 september 2017 tijdens het Gezondheidsfestival.</li> <li>2. In het najaar van 2017 en in de loop van 2018 wordt het inwonerportaal verder doorontwikkeld.</li> </ol>


<b>Project 2: Omgevingswet</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	Behoud van landschap en groenblauwe kwaliteit.
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Op grond van de Omgevingswet moeten gemeenten een omgevingsvisie maken, in afstemming met overheden en andere belanghebbenden (brandweer, GGD, Omgevingsdienst, waterschap) in hun omgeving. Bedoeling van de omgevingsvisie is dat gemeenten een langetermijnvisie voor de leefomgeving vaststellen, waarbij wordt aangegeven hoe het gebied zich moet ontwikkelen en welke onderwerpen daarbij van belang zijn. In Gooi en Vechtstreek zijn de samenwerkingsopgaven benoemd in de Regionale samenwerkingsagenda 2016-2018 (RSA) en het Uitvoeringsprogramma 2017-2018. De regiogemeenten werken dus al samen op onderwerpen, die ook in de lokaal vastgestelde omgevingsvisie geadresseerd moeten worden. Dit levert bouwstenen op die met elkaar een <i>regionaal omgevingsbeeld</i> opleveren. Dit omgevingsbeeld is de inbreng voor de regionale onderwerpen in de omgevingsvisie van de gemeenten. Het is aan de gemeenten om te bepalen op welke wijze dit regionale omgevingsbeeld een plek krijgt in de lokale omgevingsvisies waarbij regionale samenhang het uitgangspunt is.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2018 (loopt door t/m 2019)
<b>Resultaten tot nu toe</b>	In juli is het projectplan over de regionale inzet voor de omgevingsvisie (het omgevingsbeeld) aangeboden ter vaststelling in de colleges.
<b>Voortgang en planning</b>	De bouwstenen voor het regionale omgevingsbeeld zijn het resultaat van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018. Deze documenten vormen, naast de verkenningen van 2040, de feitelijke basis waar uit wordt verder gewerkt. Enkele bouwstenen zijn of worden al door de raden vastgesteld (bijvoorbeeld de regionale woonvisie). Voor andere bouwstenen wordt er, net als bij het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam, op diverse manieren gelegenheid gegeven aan de raden om zich tijdens het proces te informeren en kaders mee te geven. Dit gebeurt middels regiopodia en presentaties, met raadsinformatiebrieven en door consultatie van raden.

Tijd	Fase en Besluit omgevingsvisie (regionaal omgevingsbeeld)
Mei-najaar 2017	Fase 1: projectplan en startnotitie vaststellen door colleges
Mei 2017-eind 2017	Fase 2: opstellen bouwstenen
Najaar 2017-februari 2018	Fase 3: Verkenningen 2040, eerste schets van het omgevingsbeeld en de verschillende scenario's
April 2018 – juni 2018	<i>Presentatie introductie/consultatie raden</i>
Maart 2018 - najaar 2018	Fase 4: uitwerken scenario's en dilemma's, inbreng van inwoners in uitwerking scenario's
Sept 2018 – dec 2018	<i>Consultatie raden (opzet omgevingsbeeld)</i>
2019	Fase 5: Verwerken input en uiteindelijk vaststellen regionaal omgevingsbeeld in lokale omgevingsvisie

<b>Project 3: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A1-A27</li> <li>2. Lightrail Almere-Utrecht</li> <li>3. Regionaal openbaar vervoer</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Een gezamenlijk standpunt ten aanzien van de oplossingsrichtingen van het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<p>Aanleiding voor het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam is de verwachte toekomstige problematiek in de doorstroming op de A1 ten oosten van Amsterdam. Na 2020 treedt een bereikbaarheidsknelpunt op de A1 op tussen de knooppunten Muiderberg en Eemnes, door toename van verkeer.</p> <p>Er is een regionaal standpunt opgesteld in aanloop naar het bestuurlijk overleg tussen de overheidspartners van provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en regio's Gooi en Vechtstreek en Amersfoort die bij het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam zijn betrokken.</p> <p>Dit standpunt is opgesteld op basis van de Regionale Samenwerkingsagenda, het regiopodium van 30 januari 2017 (resultaten van de analysefase) en 28 maart 2017 (interactieve sessie over oplossingen, en bespreking in raden (april t/m juni). Vanaf de start van het onderzoek is het standpunt van Gooi en Vechtstreek dat alleen een integrale aanpak vanuit economie, landschap en bereikbaarheid passend is.</p>
<b>Voortgang en planning</b>	<p>Het onderzoek loopt tot eind 2017. Dan maken betrokken partners afspraken over de invulling van het vervolgtraject voor korte (2020), middellange (2028) en langere termijn (na 2028). Het onderzoek is in 2014 gestart met een kwartiermakersfase, in 2015 volgde de analysefase en momenteel worden oplossingen uitgewerkt.</p> <p>De oplossingsrichtingen worden nu zover uitgewerkt dat in november 2017 (in het landelijk overleg MIRT) een gericht besluit kan worden genomen. De bedoeling is om in het Bestuurlijk Overleg MIRT van 1 november 2017 afspraken te maken over de uitgewerkte oplossingsrichting(en) van alle onderzoeken in Noordwest Nederland, waaronder het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam.</p> <p>Als op 1 november a.s. wordt besloten een vervolg te geven aan het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam kan dat op de volgende manieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een vervolg via samenwerkingstafels en bestaande gremia, bijvoorbeeld MRA of Utrecht,</li> <li>- Een verdiepend MIRT-onderzoek,</li> <li>- Maatregelen worden geagendeerd in de gebiedsgerichte programma-aanpak voor de MRA en/of Utrecht, die het rijk onlangs in het leven heeft geroepen,</li> <li>- Een startbeslissing voor een MIRT-verkenning.</li> </ul>

<b>Project 4: Uitvoeringsprogramma algemene zaken</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Gemeenten ontwikkelen een uitvoeringsprogramma om een aantal – voornamelijk PIOFACH – taken gezamenlijk uit te voeren. Dit om deze taken meer effectief en efficiënt uit te voeren.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Maart 2017 – december 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	In het licht van de Ahri-procedure tuigen de gemeenten en de Regio nu geen uitvoeringsprogramma algemene zaken op. De gemeenten en de Regio werken wel samen aan de volgende projecten: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. voorbereiding en implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;</li> <li>2. doorontwikkeling van de gemeentelijke samenwerking op P&amp;O-gebied (P&amp;O kring);</li> <li>3. samenwerking op privacy- en gegevensbescherming;</li> <li>4. instellen van een controllersoverleg om grip te krijgen op de gezamenlijke planning en control aangelegenheden.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	Er komt vooralsnog geen uitvoeringsprogramma sociale zaken. Voortgang per project: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. er is een analyse opgesteld op de gezamenlijke voorbereiding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren met als doel eind september 2017 tot samenwerkingsafspraken te komen;</li> <li>2. besluitvorming doorontwikkeling P&amp;O-gebied wordt einde van het jaar verwacht;</li> <li>3. besluitvorming op privacy- en gegevensbescherming wordt aan het einde van het jaar verwacht;</li> <li>4. het controllersoverleg is ingesteld.</li> </ol>

## 2. Programma Economie & Arbeidsmarkt

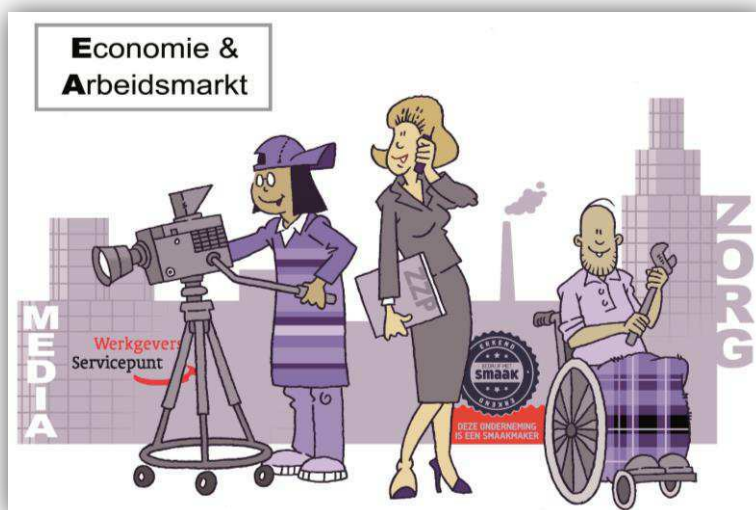

<b>Project 1: Verkenning regionaal investeringsfonds</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	Economie en creatieve bedrijvigheid
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Stimulering van de regionale economie, toename van werkgelegenheid, verbetering van leefomgeving en het vestigingsklimaat.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 - december 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	De verkenning is opgestart met de Economic Board Gooi & Vechtstreek, Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM), InnovationQuarter, Provincie Noord-Holland, MKB Doorstart, Kredietunie Gooi en Vechtstreek.
<b>Voortgang en planning</b>	De wenselijkheid, scope en haalbaarheid van een regionaal investeringsfonds op schaal van Gooi en Vechtstreek wordt onderzocht. Eind 2017 worden de resultaten van verkenning besproken in de Economic Board Gooi en Vechtstreek en met de portefeuillehouders Economie & Innovatie.

<b>Project 2: Doorontwikkeling werkgeversdienstverlening</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Economie en creatieve bedrijvigheid</li> <li>2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden</li> <li>3. Inclusieve arbeidsmarkt</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een innovatief en optimaal functionerend Werkgeversservicepunt dat goed aansluit bij de vraag van werkgevers.</li> <li>2. Eén loket voor werkgevers en ondernemers in onze regio.</li> <li>3. Een goede afstemming, verbinding en uitwisseling tussen werkgevers, gemeenten, UWV, scholen, kenniscentra én het werkgeversservicepunt.</li> <li>4. Een optimaal functionerend Werkgeversservicepunt dat ertoe leidt dat meer mensen met een bijstandsuitkering duurzaam uitstromen naar betaald werk.</li> <li>5. Arbeidsmarktdynamiek waarbij er passende banen (betaald en niet-betaald) worden gerealiseerd en toegankelijk gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na een inventarisatie is de dienstverlening van het Regionale Meld en Coördinatiefunctie en het Werkgeversservicepunt beter op elkaar afgestemd, onder meer als het gaat om kennisoverdracht, processen, informatie-uitwisseling en afstemming op casusniveau tussen professionals.</li> <li>2. Tussentijdse evaluatie en vaststelling voortgangsrapportage.</li> <li>3. Verdere uitwerking bestuursopdracht werkgeversdienstverlening.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	Besluitvorming bestuursopdracht werkgeversdienstverlening in december 2018, in januari 2018 starten met de implementatie.

<b>Project 3: Integrale aanpak: economie, participatie en arbeidsmarkt</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Economie en creatieve bedrijvigheid stimuleren</li> <li>2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden</li> <li>3. Inclusieve arbeidsmarkt</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrale aanpak waarbij het creëren, aantrekken en behouden van bedrijvigheid in onze regio wordt gekoppeld aan het creëren, aantrekken en behouden van werkgelegenheid.</li> <li>2. Integrale beleidsafwegingen op de vlakken economie, ruimtelijke ordening en arbeidsparticipatie.</li> <li>3. Beschikken over actuele informatie m.b.t. de regionale arbeidsmarktsituatie en ons economisch profiel om hiermee de uitvoering van het integrale beleid te ondersteunen.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	September 2017 – juni 2018 (was: januari 2017 – december 2017)
<b>Resultaten tot nu toe</b>	Start analysefase; de economische context en de arbeidsmarktsituatie in regio Gooi en Vechtstreek is in kaart gebracht en beschreven.
<b>Voortgang en planning</b>	Begin 2018 advisering op conceptbeleidsplan door raden, vaststelling beleidsplan in tweede kwartaal 2018.

<b>Project 4: Verkenning innovatieaanpak digitale media en creatie</b>	
<b>RSA Speerpunt</b>	Economie en creatieve bedrijvigheid stimuleren
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid en hierdoor meer arbeidsparticipatie door inwoners uit onze regio.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	September 2016 – juli 2017 (activiteiten agenda lopen door)
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<p>De verkenning heeft geleid tot de Agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie. Deze agenda bevat zes uitvoeringslijnen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regionaal start-up/scale-up programma Gooi en Vechtstreek</li> <li>2. Broedplaatsenstrategie en –aanpak Gooi en Vechtstreek</li> <li>3. (Door)ontwikkeling regionale living innovatielabs</li> <li>4. Cross-over expeditie Gooi en Vechtstreek: Media &amp; Toerisme en recreatie - Media &amp; Zorg-economie – Media &amp; Duurzaamheid/Circulair</li> <li>5. Doorontwikkeling Dutch Media Week</li> <li>6. Organisatorische herijking – werkplan CLICKNL – Media&amp;ICT</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	De Agenda is in maart 2017 vastgesteld. Bij de verdere uitwerking worden de innovatieplatforms iMMovator en iZovator betrokken en er wordt specifiek ingezet op regionale verbreding van de projecten. Het regionaal aanwezige netwerk wordt geactiveerd en tot innovatie gestimuleerd door de aanpak in de regionale Agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie. De agenda wordt vanuit de Regio verder uitgewerkt in afstemming met het ambtelijk overleg Economie & Innovatie. De voortgang wordt gemonitord en jaarlijks geëvalueerd door de stuurgroep Economie & Innovatie.

<b>Project 5: Regionaal mediacentrum</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Een kwalitatief hoogwaardige nieuws-en informatievoorziening door de lokale omroep.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	September 2016 – september 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	De verkenning naar een hoogwaardige nieuws-en informatievoorziening door de lokale omroep is afgerond. Enkele regionale omroepen hebben hun samenwerking geïntensiveerd.
<b>Voortgang en planning</b>	NH (mediabedrijf) is gevraagd om een voorstel te doen voor een regionale streekomroep. Dit najaar wordt besproken hoe hiermee wordt omgegaan.



<b>Project 6: Verbinding arbeidsmarkt, onderwijs en zorg</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden</li> <li>2. Inclusieve arbeidsmarkt</li> <li>3. Economie en creatieve bedrijvigheid</li> <li>4. Hoger onderwijs</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters daalt naar onder de 300.</li> <li>2. De 585 bankzitters van 18 tot 23 jaar (jongeren buiten beeld) zijn begin 2017 in beeld bij het onderwijs, RBL en/of gemeente. Uit deze groep worden minimaal 100 jongeren gekoppeld aan werk, onderwijs, dagbesteding of een activeringstraject.</li> <li>3. Aan alle circa 200 (kwetsbare) jongeren van de praktijkschool, voortgezet speciaal onderwijs en Entree die in juli 2016 van school zijn gekomen wordt een perspectief geboden. Dit wordt vastgelegd in een toekomstplan.</li> <li>4. 25 jongeren hebben jaarlijks een leerwerkplek.</li> <li>5. Er is een overzicht van instellingen op het gebied van zorg, welzijn, hulpverlening en arbeidstoeleiding voor (kwetsbare) jongeren. Dit overzicht is digitaal te benaderen.</li> <li>6. Partijen die een inhoudelijke rol spelen bij de werktoeleiding van jongeren werken beter met elkaar samen en stemmen processen en werkwijzen op elkaar af.</li> <li>7. Medio 2017 kunnen jongeren terecht bij een digitaal platform – JONCA - voor vragen op het gebied van onderwijs, werken en hulpverlening.</li> <li>8. Inzicht in of/hoe de rol van Internationaal Onderwijs binnen regio Gooi en Vechtstreek kan worden versterkt. Mede ter versterking van een gunstig economisch vestigingsbeleid en voorzieningenniveau.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke uitvoering van regionale programma Match op Meedoen door bestuurders van het voortgezet onderwijs, het MBO College Hilversum en gemeenten in Gooi en Vechtstreek.</li> <li>2. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is beperkt tot 260.</li> <li>3. 90% van de bankzitters is in beeld. 35. In het Netwerk Match op Meedoen – dat bestaat uit gemeenten, UWV en het Werkgeversservicepunt - zijn afspraken gemaakt over de toeleiding van kwetsbare jongeren naar werk.</li> <li>4. Er is een JONCA-team gestart dat de opzet heeft onderzocht van een digitaal platform voor vragen op het gebied van onderwijs, werken en hulpverlening.</li> <li>5. Uitvoering haalbaarheidsonderzoek naar het versterken van het internationaal onderwijs in Gooi en Vechtstreek.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De projecten en initiatieven binnen Match op Meedoen worden gecontinueerd en de resultaten daarvan zullen we structureel monitoren en waar nodig bijsturen.</li> <li>2. In het eerste kwartaal van 2018 wordt een regionaal overzicht opgeleverd van instellingen op het gebied van zorg, welzijn, hulpverlening en arbeidstoeleiding voor (kwetsbare) jongeren.</li> <li>3. Uitvoering geven aan het ontwerp van het online platform van het JONCA-team. Eind 2018/begin 2019 besluitvorming over het al dan niet doorzetten van dit initiatief.</li> <li>4. Eerste kwartaal 2018 besluitvorming over of en in welke mate het internationaal onderwijs in de regio wordt versterkt.</li> <li>5. Eind 2018 oplevering haalbaarheidsonderzoek.</li> </ol>

<b>Project 7: Beschut werk</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Economie en creatieve bedrijvigheid</li> <li>2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden</li> <li>3. Inclusieve arbeidsmarkt</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een adequate invulling van beschut werk.</li> <li>2. Voldoende beschikbaarheid van beschutte werkplekken voor mensen die hiervoor in aanmerking komen.</li> <li>3. Beheer van afspraken die we met partijen maken in het kader van beschut werk.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – oktober 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er is een analyse uitgevoerd naar de wijze waarop gemeenten invulling kunnen geven aan beschut werk. Op basis hiervan is een voorstel gedaan dat op 12 januari 2017 geaccordeerd is door de stuurgroep 18+.</li> <li>2. Er is een overeenkomst Beschut Werk opgesteld op basis waarvan beschut werk kan worden uitgevoerd. Deze overeenkomst wordt in september 2017 voorgelegd aan de stuurgroep 18+.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Als gemeenten besluiten tot een voorziening voor beschut werk zoals in de overeenkomst is voorgesteld, dan zal de overeenkomst in het laatste kwartaal van 2017 worden voorgelegd aan de colleges van B&amp;W.</li> <li>2. In oktober 2017 levert de Regio een handreiking/werkinstructie op voor uitvoerende medewerkers van gemeenten.</li> <li>3. Vanaf het derde kwartaal van 2017 evalueert de Regio – indien de overeenkomst zoals genoemd onder 1 is vastgesteld - doorlopend de uitvoering van Beschut Werk onder inwoners. Dit doen we door te monitoren en door het indicatieproces bij gemeenten en UWV te evalueren.</li> </ol>

<b>Project 8: Arbeidsontwikkeling</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Economie en creatieve bedrijvigheid</li> <li>2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden</li> <li>3. Inclusieve arbeidsmarkt</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een effectieve inrichting van arbeidsontwikkeling waardoor mensen duurzaam uitstromen naar betaald werk.</li> <li>2. De eventueel gezamenlijke inkoop van arbeidsontwikkeling.</li> <li>3. De eventuele inrichting van het gezamenlijk beheer van arbeidsontwikkeling.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Juni 2017 – december 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	Dit project is zomer 2017 van start gegaan. Momenteel wordt een verkenning uitgevoerd naar de gezamenlijke inkoop van arbeidsontwikkeling/re-integratie.
<b>Voortgang en planning</b>	We formuleren komende periode gezamenlijk de uitgangspunten en doelstellingen die bij arbeidsontwikkeling/re-integratie van belang zijn. Hiervoor vindt om te beginnen een evaluatie plaats van de huidige lokale inkoop en aanpak bij gemeenten, zodat er duidelijkheid is over wat mogelijk de kwalitatieve en financiële voordelen van gezamenlijke inkoop zijn. Besluitvorming is in november 2017 afgerond waarna een gezamenlijk inkooptraject begin 2018 van start kan gaan.

<b>Project 9: Schuldhulpverlening</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Economie en creatieve bedrijvigheid</li> <li>2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden</li> <li>3. Inclusieve arbeidsmarkt</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een effectieve inrichting van schuldhulpverlening waarbij dienstverlening zich behalve op het oplossen van de financiële problemen van een inwoner ook richt op psychosociale problemen, of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie.</li> <li>2. Een verkenning uitvoeren naar de gezamenlijke inkoop van schuldhulpverlening.</li> <li>3. De eventuele gezamenlijke inkoop van schuldhulpverlening.</li> <li>4. De eventuele inrichting van het gezamenlijk beheer van schuldhulpverlening.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Mei 2017 – december 2018 (aangepast: september 2017 - december 2018)
<b>Resultaten tot nu toe</b>	De planning van dit project is aangepast. Het project gaat in september van start. Naar inschatting heeft het project een looptijd van september 2017 – december 2018.

<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluatie van de huidige lokale inkoop en aanpak bij gemeenten.</li> <li>2. Formuleren van gezamenlijke uitgangspunten en doelstellingen bij schuldhulpverlening.</li> <li>3. Naar aanleiding van de evaluatie en het formuleren van gezamenlijke uitgangspunten zullen we begin 2018 starten met een gezamenlijk inkooptraject.</li> <li>4. Najaar 2017 onderzoekt de Regio de praktische uitwerking van artikel 89 van de Zorgverzekeringswet, zoals hoe we hier het best invulling aan kunnen geven en welke randvoorwaarden er gelden.</li> </ol>
------------------------------	---

<b>Project 10: Huishoudelijke hulp toelage</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Economie en creatieve bedrijvigheid</li> <li>2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden</li> <li>3. Inclusieve arbeidsmarkt</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een grotere bekendheid van Schoonhuis onder inwoners van regio Gooi en Vechtstreek, zodat het gebruik toeneemt.</li> <li>2. Een bredere inzetbaarheid van de Huishoudelijke hulp toelage (HHT) om de werkgelegenheid in de zorgbranche verder te stimuleren.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Februari 2017 – oktober 2017 (aangepast: juni 2017 – december 2018)
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeenten en de Regio hebben samen met zorgaanbieders een concept-Zorgbanepact ontwikkeld.</li> <li>2. Het Rijk heeft toestemming verleend voor het breder inzetten van de Huishoudelijke hulp toelage om uitvoering te geven aan het Zorgbanepact. (Het gaat hierbij om de rijkssubsidie van € 7.8 miljoen die gemeenten toegekend hebben gekregen om werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp te behouden en om meer werk te creëren.)</li> <li>3. ActiZ, BTN, CNV Zorg &amp; Welzijn, FNV Zorg &amp; Welzijn, MBO Raad, NVZ en het ministerie van VWS hebben een arbeidsmarktagenda opgesteld waarin zij afspraken maken die moeten leiden tot meer werkgelegenheid in de zorg.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	Nadere uitwerking van het Zorgbanepact, eind 2017 bestuurlijk vaststellen van het Zorgbanepact, begin 2018 implementatie.

<b>Project 11: Governance Tomingroep</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Economie en creatieve bedrijvigheid</li> <li>2. Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden</li> <li>3. Inclusieve arbeidsmarkt</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het hebben van een eensluidende governance-structuur voor de Tomingroep waarvoor draagvlak bestaat bij de betrokken partijen.</li> <li>2. De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, zodat opschoning van de governance-structuur kan plaatsvinden.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afronding governance-traject.</li> <li>2. Aangepaste gemeenschappelijke regeling bij alle gemeenten in procedure gebracht voor de vaststelling door de gemeenteraden. Bij een aantal gemeenten heeft de vaststelling inmiddels plaatsgevonden.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	Eind 2017 vaststelling gemeenschappelijke regeling door regiogemeenten.

### 3. Programma Wonen, Vastgoed & Leegstand




Project 1: Actieprogramma uitvoering regionale woonvisie (RAP2)	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke regie op sociale woningbouw</li> <li>2. Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een passend woningaanbod voor jong en oud, rijk en arm, kleine en grote huishoudens, valide en minder valide inwoners.</li> <li>2. Een adequate implementatie van de actielijnen zoals beschreven in de regionale woonvisie.</li> <li>3. Een effectieve samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties, onder andere door afgestemde werkwijzen en processen.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2018 (doorlopend tot 2020)
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opstellen en vaststelling regionale woonvisie.</li> <li>2. Een regionaal actieprogramma wonen is opgesteld, door colleges vastgesteld en ligt ter vaststelling voor bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland.</li> <li>3. Na vaststelling van het regionaal actieprogramma wonen door Gedeputeerde Staten van (najaar 2017) vraagt de Regio € 1 miljoen subsidie aan bij de Provincie Noord Holland.</li> <li>4. De evaluatie van de Huisvestingsverordening/urgentieregeling is gestart.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt een regionale wooncoach ingesteld met de opdracht om de diverse lokale initiatieven te coördineren, stimuleren en evalueren.</li> <li>2. Vanaf het derde kwartaal van 2017 is er één regionaal aanspreekpunt voor vernieuwende initiatieven op het gebied van wonen en zorg beschikbaar.</li> <li>3. Eind 2017 is er een 'Biedboek Middeldure huur' gereed om marktpartijen te informeren en te interesseren in regionale locaties voor middensegment huurwoningen. De bedoeling is om potentiële locaties te bundelen en zo aantrekkelijke proposities te realiseren.</li> <li>4. Om gemeenten en hun partners te informeren en te inspireren met succesvolle buurtgestuurde initiatieven, starten we najaar 2017 met het goede voorbeeldenboek 'Buurt gestuurd samenwerken'.</li> <li>5. In het vierde kwartaal van dit jaar is de regionale woonmonitor beschikbaar. Hiermee volgen we de voortgang van de doelstellingen uit de regionale woonvisie én de lokale prestatieafspraken op een voor alle partijen vergelijkbare manier.</li> <li>6. De evaluatie van de Huisvestingsverordening/urgentieregeling en van de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen levert een integraal advies op over een (nieuw) woonruimteverdeelsysteem. Aan de hand hiervan kunnen colleges besluiten over invulling van de nieuwe verordening die uiterlijk medio 2019 door de gemeenteraden moet zijn vastgesteld.</li> </ol>

<b>Project 2: Regionale aanpak leegstand</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Economie en creatieve bedrijvigheid</li> <li>2. Hergebruik in plaats van nieuwbouw</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Terugdringen van leegstand in Gooi en Vechtstreek.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Juni 2016 - februari 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De herprofilering van de aanloopstraten heeft een belangrijke impuls gekregen door de leegstands aanpak vanuit de Economic Board Gooi en Vechtstreek. Er is voor verschillende aanloopstraten van centrumwinkelgebieden een gezamenlijk toekomstperspectief opgesteld. De pilotgebieden zijn: Havenstraat (Hilversum); Winkelcentrum de Bijvanck (Blaricum); Vlietlaan (Bussum/Gooise Meren).</li> <li>2. De ondernemers en eigenaren in de aanloopstraten gaan aan de slag om in kaart te brengen op welke manier en op welke termijn zij de toekomst vorm geven. Het gezamenlijke toekomstperspectief dat zo ontstaat biedt houvast om een vitale toekomst te geven aan deze winkelgebieden.</li> <li>3. Op termijn zal het ruimtelijk gebruik om nieuwe vormen vragen, met het doel om het aantal leegstaande winkelpanden te verminderen. Door het project Regionale aanpak leegstand is een substantiële transformatie van de aanloopstraten opgestart.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	Dit project is begin 2017 afgerond. De conclusies worden meegenomen bij de actualisatie van de regionale detailhandelsvisie. Daarnaast werken de verschillende gemeenten aan een oplossing op maat voor de gesignaleerde belemmeringen.

<b>Project 3: Actualisatie visie werklandschappen en herijking transformatiefonds</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Economie en creatieve bedrijvigheid</li> <li>2. Hergebruik in plaats van nieuwbouw</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<p>Het betreft de actualisatie van de visie werklocaties uit 2008. In die periode stond het aanbod aan formele werklocaties onder druk; er was meer vraag dan er beschikbaar was. De gemeenten hebben in 2008 uitgesproken dat zij de bestaande voorraad zo goed mogelijk wilden benutten en afname van werklocaties wilden remmen. In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd, niet alleen heeft er een economische transitie plaatsgevonden, ook veranderen de voorkeuren van bedrijven. De actualisatie van de visie en daaruit volgende herijking van het transformatiefonds speelt hierop in. Doelstellingen zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het bieden van goede (kwalitatief) passende ruimte voor bedrijven,</li> <li>2. voorkomen van overaanbod van werklocaties in Gooi en Vechtstreek en, op deze wijze,</li> <li>3. stimuleren van de economie.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Juni 2016 – december 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	De kwalitatieve en kwantitatieve passende vestigingsruimte voor bedrijven wordt in beeld gebracht door onderzoeksbureau STEC. Tevens is geanalyseerd in hoeverre het huidige aanbod aan bedrijfsruimte aansluit bij de vraag. Naast de zogenaamde ‘formele’ werklocaties; de bedrijventerreinen en kantorenlocaties, zijn ook de informele werklocaties (bedrijvigheid in het stedelijk weefsel) in beeld gebracht. Hieruit komt naar voren dat er in Gooi en Vechtstreek behoefte is aan schuifruimte omdat een aantal bedrijven klem zit op de huidige locatie. Daarnaast is er sprake van een toenemend belang aan informele werklocaties.
<b>Voortgang en planning</b>	Op dit moment wordt de laatste hand aan het onderzoeksrapport gelegd. In het najaar van 2017 wordt het onderzoek met aanbevelingen voor het vervolg, aangeboden aan de bestuurders in de Stuurgroep Economie en Innovatie.

## 4. Programma Ruimte & Mobiliteit

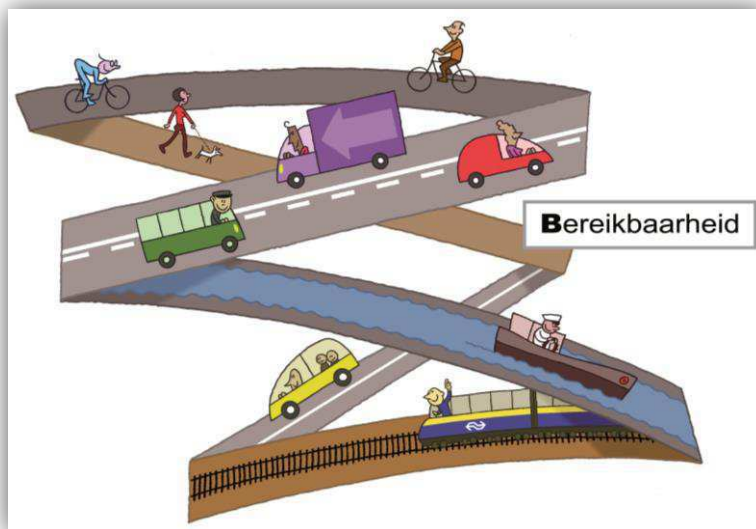

Project 1: Toekomstbeeld landschap	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit</li> <li>2. Recreatie en toerisme</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Een toekomstbeeld landschap dat inspeelt op de actuele ontwikkelingen, toekomstige opgaven en ambities. Centraal staat de kwaliteit van het unieke landschap.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	Na een uitvraag is een landschapsarchitectenbureau (MTD) ingehuurd om het landschapsbeeld op te stellen. Ter uitvoering hiervan zijn interviews gehouden met belangrijke stakeholders in het landschap (zoals LTO, GNR, recreatiesector) en de gemeentelijke deskundigen. Dit heeft geleid tot het eerste concept (juli).
<b>Voortgang en planning</b>	<p>Omdat het toekomstbeeld voor het landschap mede als bouwsteen dient voor het regionale omgevingsbeeld, is de totstandkoming in 2 fasen opgedeeld. De eerste fase, die in concept klaar is, ziet op de waardenstelling van het huidige landschap en de kansen en opgaven.</p> <p>In het kader van het omgevingsbeeld wordt een integrale afweging gemaakt over de toekomst van de regio, waaronder keuzes voor de toekomst van het landschap. Als deze keuzes zijn gemaakt, wordt het toekomstbeeld voor het landschap meer in detail uitgewerkt, zodat er vervolgens ook concreet uitvoering aan kan worden gegeven. De besluitvorming over de eerste fase wordt ingebed in het proces van het omgevingsbeeld.</p>

<b>Project 2: Business case snelfietspaden</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regionaal openbaar vervoer</li> <li>2. Regionale verkeersregie</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<p>Betere bereikbaarheid en verbondenheid binnen de regio en de omliggende kernen. Mogelijk ontlasten van het wegennet door het aanbod van alternatieve woon-werkmodaliteiten.</p> <p>Onderstrepen van de landschappelijke en ruimtelijke identiteit van de regio.</p>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Eind 2016 aftrap Plan van Aanpak MRA – einddatum nog onbekend
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<p>Er spelen veel ontwikkelingen op het gebied van snelfietspaden. De MRA werkt aan een netwerk en in het MIRT onderzoek komt een netwerk in de regio prominent als maatregel in beeld. Met de Business case snelfietspaden sluiten we daar zo goed mogelijk bij aan. Zo zijn de beoogde routes ingebracht. Doel van de business case is te komen tot een overzicht van:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het beoogde netwerk in de regio,</li> <li>2. de knelpunten en kosten om dit te realiseren (en de mogelijkheden om middelen te krijgen),</li> <li>3. de verwachte effectiviteit van het netwerk voor de mobiliteit en leefbaarheid.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	De business case resulteert in een rapportage waarin bovengenoemd overzicht wordt gegeven. Op basis hiervan, kan de bestuurlijke afweging worden gemaakt of men uitvoering wil gaan geven aan het fietsnetwerk. De resultaten zullen tevens onderdeel zijn van de 'bouwsteen' mobiliteit voor het regionale omgevingsbeeld. De rapportage wordt eind 2017 verwacht.

<b>Project 3: Naarden buiten de Vesting en Verder met de Vesting Muiden</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit</li> <li>2. Recreatie en toerisme</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<p>Agrarische structuurverbetering/kavelruil (door Regio getrokken deelproject)</p> <p>Het doel van dit project is het realiseren van een zo optimaal mogelijke agrarische structuur. Hierdoor kan tevens de benodigde grond voor de vaarverbinding worden verkregen. Hiervoor is één agrarisch bedrijf uitgeplaatst.</p>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	De zeven deelprojecten hebben als beoogde einddatum december 2020. Deelprogramma Agrarische structuurverbetering/kavelruil juni 2016.
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<p><u>Naarden buiten de Vesting</u>: het programma is in uitvoering. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opstarten van de projectteams. De gemeente Gooise Meren heeft een participatietraject uitgevoerd dat heeft geresulteerd in een concept-visie op de passantenhaven bij Naarden. De Regio is verantwoordelijk voor het algemene programmamanagement en voor de agrarische structuurverbetering die inmiddels is afgerond.</p> <p>Voor <u>Verder met de Vesting Muiden</u> moet het programma nog definitieve vorm krijgen met projecten die financieerbaar en uitvoerbaar zijn. Dit proces verloopt voortvarend. Ondertussen wordt reeds uitvoering gegeven aan 'no regret-projecten' zoals het herstellen van de gebiedseigen grond op het voormalige tracé van de A1.</p>
<b>Voortgang en planning</b>	<p>Voor beide projecten geldt 2020 als streefjaar voor de afronding.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Naarden buiten de Vesting</u>: Het graven van de vaarverbinding zal pas in 2019/2020 plaatsvinden. In de periode daarvoor worden verschillende projecten al opgepakt.</li> <li>2. Voor <u>Verder met de Vesting Muiden</u> is de verwachting dat najaar 2017 duidelijkheid komt over de definitieve inhoud van het programma. Dat is een belangrijk ijkpunt voor dit programma. Groot project in Muiden is het herstel van de vestingwerken. Eind 2017 zal hier de eindinrichting van de schootvelden starten.</li> </ol>



<b>Project 4: Inkoop Doelgroepenvervoer</b>	
<b>RSA Speerpunten:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regionaal openbaar vervoer verbeteren</li> <li>2. Gezonde en vitale regio Gooi en Vechtstreek</li> <li>3. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein</li> </ol>
<b>Toelichting op het project:</b>	Vervoer is een belangrijke randvoorwaarde voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. Om voor hen participatie mogelijk te maken en te borgen, zullen de diverse vormen van vervoer die de gemeenten nu uitvoeren (zoals de Wmo-taxi, leerlingenvervoer, dagbesteding vervoer, WSW vervoer) veranderd en/of aangepast moeten worden. Daarbij kijken we onder meer naar factoren als de verbinding met het OV en de eigen verantwoordelijkheid/eigen kracht van de aanvrager. Dit moet leiden tot een duurzaam en efficiënt vervoerssysteem in de regio.
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een effectieve inrichting van het doelgroepenvervoer.</li> <li>2. Een integraal beleidsmatig kader op basis waarvan het doelgroepenvervoer wordt ingericht.</li> <li>3. De inkoop en het beheer van het doelgroepenvervoer.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Februari 2017 – 31 december 2018 (aangepast: September 2017 - december 2018)
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De planning van dit project is aangepast. Het project is in september 2017 van start gegaan en loopt tot december 2018.</li> <li>2. Inventarisatie vervoersnetwerk (waar doelgroepen gebruik van maken): waar zitten in het huidige systeem knelpunten, en waar zijn verbindingen mogelijk tussen typen doelgroepenvervoer en het reguliere OV?</li> <li>3. Op basis van analyse vervoersnetwerk opstellen scenario's voor een optimaal gebundeld vervoersnetwerk in Gooi en Vechtstreek.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	In oktober 2017 vindt een bespreking plaats met de portefeuillehouders sociaal en fysiek domein over het plan van aanpak om een gebundeld vervoersnetwerk in Gooi en Vechtstreek te ontwikkelen. We presenteren verschillende scenario's om aan het gebundeld vervoersnetwerk invulling te geven. Op basis van de uitkomsten volgt in het laatste kwartaal van 2017 een voorstel om de gewenste inrichting van het vervoersnetwerk te realiseren.



## 5. Programma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme



Project 1: Infrastructuur cultuur en erfgoed	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren</li> <li>2. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regionaal beleid ten aanzien van cultuur en erfgoed, een regionale infrastructuur inclusief financieringsmodel.</li> <li>2. Verbinden van landschap en cultuur en erfgoed, als belangrijk onderdeel van de waardenmix van regio Gooi en Vechtstreek.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 - september 2019
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De bovenlokale cultuur en erfgoedopgaven zijn benoemd en worden gerealiseerd via de samenwerkingsstructuur die is ingericht. Dit gebeurt zowel ambtelijk (cultuur en erfgoed) als bestuurlijk via de Stuurgroep Cultuur &amp; Erfgoed, Recreatie &amp; Toerisme (CERT), en met de cultuur en erfgoedinstellingen in Gooi en Vechtstreek. Deze overleggen vormen de basis voor de uitvoeringsagenda van het programmadeel Cultuur en Erfgoed van CERT.</li> <li>2. Er is externe financiering verkregen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Voorjaar 2017 is door het Mondriaanfonds een meerjarige subsidiebijdrage toegekend waarmee in de organisatie van kwaliteit van cultuur en erfgoed en in de samenwerking tussen de instellingen kan worden geïnvesteerd.</li> <li>b) Voorjaar 2017 is door het Fonds Cultuurparticipatie een meerjarige subsidie verstrekt voor de regionale uitrol via het project CMK. De subsidie is toegekend via Plein C en provincie Noord-Holland op basis van jaarlijkse prestaties (Zie project: Uitrol cultuureducatie met kwaliteit).</li> </ol> </li> <li>3. De waarde van cultuur en erfgoed en de waarde van het landschap zijn door alle gemeenten herkend als belangrijke uitgangspunten voor positionering van de regio in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Een regioconservator is aangesteld die verbinding, (digitale)toegankelijkheid en presentatie van collecties realiseert. Er is een verkenning uitgevoerd naar een relevante gezamenlijke organisatievorm en backoffice.</li> <li>4. Er is een start gemaakt om ruimte en cultuur te verbinden. Hiervoor zijn twee kwaliteitsbeelden c.q. bouwstenen ontwikkeld voor het toekomstige regionale omgevingsbeeld die op elkaar aansluiten.</li> <li>5. In 2017 is gewerkt aan een uniforme vertegenwoordiging van cultuur en erfgoed vanuit de regio in de MRA en Utrecht en de relevante provincies. Gevoed vanuit de overleggen kan de programmacoördinator gemeenten bovenlokaal vertegenwoordigen.</li> </ol>

	6. Een verkenning loopt naar een gezamenlijke organisatievorm voor culturele instellingen. Deze is in oktober 2017 afgerond. De uitkomsten worden in een voorstel vertaald, zie planning en voortgang.
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voor februari 2018 wordt een regionaal cultuur en erfgoedbeeld gerealiseerd(bouwsteen). Dit zal de regionale bovenlokale infrastructuur voor de komende jaren borgen en van een kader voorzien voor de gezamenlijke opgaven.</li> <li>2. Jaarlijks stellen we vervolgens actieagenda's op die regionaal begeleid en gefaciliteerd worden. Lokale cultuurnota's sluiten hierop aan.</li> <li>3. De uitkomsten van de verkenning naar een gezamenlijke organisatievorm leiden tot een voorstel op basis waarvan culturele instellingen in 2018 de samenwerking kunnen realiseren.</li> </ol>

<b>Project 2: Uitrol cultuureducatie met kwaliteit</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit</li> <li>2. Regionale samenwerking op regionale voorzieningen verbeteren</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Realiseren van vierjarige ontwikkeling van cultuureducatie in Gooi en Vechtstreek. Daarbij staat de vraag van de scholen voorop en het bestaande aanbod is uitgangspunt.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017- 1 januari 2022
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deelname aan het traject Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) - vanuit het Fonds Cultuurparticipatie/Plein C - is bereikt waarmee voor vier jaar extern geld beschikbaar is gekomen. CMK kan hierdoor regionaal worden uitgerold. Er is een projectcoördinator aangesteld, en onze regiodeelname is gewogen en goedgekeurd door Plein C.</li> <li>2. In de periode 2017 tot 2022 haken alle scholen voor basisonderwijs aan bij CMK en is een start gemaakt met voorbereiding van cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs. In deze opzet wordt ook de al vergevorderde aanpak van Hilversum meegenomen die al eerder vier jaar heeft kunnen deelnemen aan de regeling.</li> <li>3. Met het oog op het inventariseren, informeren/kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering zijn de volgende zaken uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In kaart gebracht wat er gebeurt op cultuureducatief vlak bij alle scholen voor primair onderwijs in de regio.</li> <li>• Alle scholen voor primair onderwijs zijn geïnformeerd over CMK in de regio en de mogelijkheden die dit project biedt.</li> <li>• Het project is formeel gestart en de processtructuur is ingericht.</li> <li>• De eerste Interne Cultuur Coördinator (ICC)-training is gestart.</li> <li>• De tweede ICC-training is georganiseerd en start in september.</li> <li>• Tussen de instellingen die aanbod ontwikkelen heeft afstemming plaatsgevonden, zodat vraag en aanbod daadwerkelijk op elkaar aansluiten.</li> </ul> <p>In de komende jaren zal de aanpak van cultuureducatie in onze regio zowel binnen als buitenschools meer verbonden worden met het Sociaal Domein en daarbinnen met zorg en onderwijs.</p> </li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<p>Gepland voor tweede helft 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Start traject De Cultuur Loper met eerste school in de regio.</li> <li>2. Start tweede ICC-training in bibliotheek te Weesp.</li> <li>3. Startbijeenkomst Cultuurnetwerk voor cultuuraanbieders (doel: informeren, inspireren, afstemming, netwerken/kennismaken) in oktober 2017.</li> <li>4. Manifestatie CMK voor onderwijs en cultuuraanbieders (doel: informeren, inspireren, kennismaken, netwerken) in november 2017.</li> </ol>

<b>Project 3: Cultuur en erfgoed marketing/promotie</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit</li> <li>2. Recreatie en toerisme</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Cohherent en realistisch beeld van wat Gooi en Vechtstreek te bieden heeft qua cultuur en erfgoed.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017- september 2019
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De gewenste kwaliteit is benoemd, zowel van bovenlokaal werkende instellingen op het vlak van cultuur en erfgoed als het culturele aanbod in de regio.</li> <li>2. Cultuur en Erfgoed en Toerisme en Recreatie zijn bijeen gebracht in één bestuurlijk programma, waardoor beter gewerkt kan worden aan een gezamenlijke ontwikkelstrategie voor de langere termijn.</li> <li>3. Er is een wekelijks overleg tussen de regio en het regionaal bureau Toerisme en Recreatie, waarin zowel inhoud als presentatie van cultuur en erfgoed wordt besproken.</li> <li>4. Er is sprake van wederzijdse vertegenwoordiging in de diverse overleggen zodat de aanpak op elkaar wordt afgestemd.</li> <li>5. Programmacoördinator neemt deel aan innovatie cultuurmarketingproject van Amsterdam Marketing en MRA.</li> <li>6. De regio draagt bij aan het bevorderen van samenhang bij de promotie van cultuur en erfgoed, onder andere door extra financiële impuls te geven, zoals aan de amateurkunstvoorstelling Iktoon in het Spant in juni 2017.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voortzetting van lopend programma, zodat sprake is van een evenwichtige balans in inhoud/aanbod en promotie/marketing.</li> <li>2. Als kop op de diverse citymarketing-trajecten van de gemeenten wordt een plan opgesteld voor regionale cultuur- en erfgoedmarketing, zodat we de onderlinge samenhang versterken.</li> </ol>

<b>Project 4: Floriade 2022</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit</li> <li>2. Recreatie en toerisme</li> <li>3. Duurzame energie</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stimuleren recreatie &amp; toerisme</li> <li>2. Impuls regionale economie</li> <li>3. Stimuleren innovatie en creativiteit</li> <li>4. Bevorderen samenwerking, zowel binnen als buiten de regio goed aansluiten op lopende ontwikkelingen zoals op het vlak van cultuur en erfgoed en duurzaamheid.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	2017 – 2022
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een Bestuurlijke Denktank Floriade is opgericht, bestaande uit drie regionale wethouders (Economie &amp; Innovatie/CERT, Ruimte &amp; Mobiliteit, Milieu &amp; Duurzaamheid), ambtelijk ondersteund door de gemeente Huizen en Regio Gooi en Vechtstreek.</li> <li>2. Vanuit de regiogemeenten en regionaal budget staat een bedrag van € 115.000,- gereserveerd voor o.a. ontwikkeling van een plan van aanpak Floriade. 3. Begin 2017 heeft landschapsarchitect Niek Roozen de opdracht ontvangen vanuit de Stuurgroep CERT om een plan van aanpak op te stellen voor de wijze waarop de regio Gooi en Vechtstreek kan deelnemen aan de Floriade 2022.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	Tijdens het Regiopodium op 2 oktober a.s. geeft Niek Roozen een presentatie over de richting die de regio kan inslaan. Eind 2017 wordt gezien of en welke verdere stappen worden genomen om daadwerkelijk tot de realisatie van een inzending op de Floriade 2022 in Almere te komen.

<b>Project 5: Opstellen regionale strategie en agenda recreatie en toerisme</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit</li> <li>2. Recreatie en toerisme</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Een toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – maart 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<p>In november 2016 is een startnotitie opgesteld, waarin vijf thema's zijn benoemd waarop regio Gooi en Vechtstreek moet inzetten om te komen tot een toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio. De vijf thema's zijn: 1) aanscherpen bezoekersprofiel en inspelen op aanbod, 2) versterking en uitbreiding van het toeristisch-recreatief aanbod, 3) betere bereikbaarheid, 4) toename meerdaagse verblijfsaccommodaties en 5) profilering en promotie.</p> <p>Om de regio te adviseren en de organisatie Toerisme Gooi &amp; Vecht te versterken en te ontwikkelen richting een regiomarketingorganisatie, is vanuit de stuurgroep CERT begin 2017 een adviesopdracht bij Amsterdam Marketing neergelegd. Op 15 juni 2017 is een eerste presentatie gegeven door Amsterdam Marketing in de stuurgroep CERT. Daarnaast is een MRA-onderzoek gestart door ZKA naar verblijfsaccommodaties in de gehele MRA, dat moet leiden tot een uitbreiding van het aanbod.</p>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Op 6 september 2017 wordt de uitgewerkte adviesrapportage van Amsterdam Marketing besproken in het ambtelijk overleg Recreatie &amp; Toerisme en op 14 september a.s. in de stuurgroep CERT. Op 2 oktober a.s. wordt het onderwerp op het Regiopodium besproken en op 19 oktober a.s. is Amsterdam Marketing aanwezig bij de stuurgroep CERT om nadere toelichting te geven en vragen te beantwoorden.</li> <li>2. In het najaar zal een voorstel richting gemeenteraden worden opgesteld.</li> </ol>

<b>Project 6: Onderzoek uitbesteden beheer en onderhoud recreatieve routenetwerk</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit</li> <li>2. Recreatie en toerisme</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Zorgvuldig en duurzaam beheer en onderhoud van het recreatieve routenetwerk (fietsknooppuntennetwerk, kanoroutenetwerk, sloepennetwerk en toekomstig wandelnetwerk).
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Februari 2017 – eind 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestart is met het opstellen van een achtergronddocument voor het gehele recreatieve routenetwerk (fietsen, varen, wandelen) in regio Gooi en Vechtstreek ter onderbouwing van het oprichten van een regionaal Routebureau Gooi &amp; Vechtstreek.</li> <li>2. Voor het fietsknooppuntennetwerk is voorjaar/zomer 2017 een nulmeting uitgevoerd en een offerte wordt opgesteld voor de actualisatie van het netwerk.</li> <li>3. Het definitief ontwerp Wandelnetwerk is gereed en gestart is met het opstellen van het bestek/werkbeschrijving.</li> <li>4. Een WED-subsidie (Water als Economische Drager) is aangevraagd voor o.a. elektrische oplaadpalen voor sloepen, sanitaire voorzieningen voor de waterrecreant op het land en stimulering elektrische sloepen.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	De komende periode wordt het achtergronddocument met een keuzenotitie besproken. Op 2 oktober a.s. komt het onderwerp tijdens het Regiopodium CERT aan bod en daaropvolgende vindt besluitvorming in de gemeenteraden plaats over de realisatie van een Routebureau Gooi & Vechtstreek.

<b>Project 7: Ontwikkeling waterkaart/magazine</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit</li> <li>2. Recreatie en toerisme</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Overzichtelijke en aantrekkelijke informatie over de recreatieve vaarwegen en de daarbij behorende faciliteiten op het land (aanlegvoorzieningen, oplaadpunten, horeca, verblijfsaccommodaties, verhuurmogelijkheden, culturele bezienswaardigheden).
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	December 2016 – april 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	Het project Ontwikkeling waterkaart/magazine is in eerste instantie opgestart vanuit de gemeenten Gooise Meren, Weesp, Wijdmeren en Stichtse Vecht. Daar is de wens uitgesproken om het project in regionaal verband op te pakken. Het was uiteindelijk niet meer mogelijk om de waterkaart/magazine voor het seizoen 2017 te realiseren, vandaar dat er dit jaar voor is gekozen om de bestaande waterkaart Loosdrechts Plassengebied/Vecht te herdrukken en het project in 2018 te realiseren.
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Met het ambtelijk overleg Recreatie &amp; Toerisme en Toerisme Gooi &amp; Vecht worden de mogelijkheden voor realisatie van een waterkaart/magazine in 2018 nader onderzocht. Offertes zijn opgevraagd.</li> <li>2. 7 juli 2017 is een WED-subsidie (Water als Economische Drager) ingediend, waarbij ook de realisatie van een waterkaart is opgenomen voor het Loosdrechts Plassengebied, de Vecht, Gooise Meren en het Gooimeer om extra financiering te verwerven.</li> </ol> <p>In het najaar wordt bekend of de WED-subsidie is toegekend en vindt uitwerking plaats van de mogelijkheden voor realisatie van het regionale watermagazine in 2018.</p>

## 6. Programma Jeugd & Onderwijs



Project 1: Inkoop Jeugd GGZ	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein</li> <li>2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De transformatie in de jeugdzorg voortzetten door inkopen van de jeugd GGZ onder nieuwe voorwaarden. We zetten een eerste stap gezet naar integrale jeugdzorg doordat aanbieders van verschillende jeugdhulpcontracten kunnen samenwerken onder één beschikking.</li> <li>2. Onnodige classificering van jeugdigen verminderen, onder meer door ervoor te zorgen dat het vaststellen van een classificatie, zoals ADHD, niet langer een voorwaarde is om voor jeugdhulp bekostiging te krijgen.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2017 (ten behoeve van de contractering voor de periode 2018-2020)
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluatie uitvoering jeugd GGZ.</li> <li>2. Uitvoering kostprijsonderzoek naar maatschappelijk aanvaardbare tarieven voor de Jeugd GGZ.</li> <li>3. Marktconsultaties onder Jeugd GGZ aanbieders.</li> <li>4. Op basis van de resultaten zoals genoemd onder 1, 2 en 3, is een toelatingsdocument opgesteld met daarin eisen die gelden voor de uitvoering van de jeugd GGZ.</li> <li>5. Op 10 juli 2017 is het toelatingsdocument jeugd GGZ openbaar gemaakt via <a href="http://www.aanbestedingskalender.nl">www.aanbestedingskalender.nl</a>.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	Uiterlijk eind 2017 zullen we de inkoopprocedure afronden met de ondertekening van de overeenkomsten.

<b>Project 2: Versterken Pleegzorg</b>	
<b>RSA Spierpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein</li> <li>2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een effectieve inrichting van de pleegzorg.</li> <li>2. Een integraal uitvoeringskader op basis waarvan de pleegzorg wordt georganiseerd. Dit onder andere op basis van de ervaringen in 2015 en 2016.</li> <li>3. De inkoop en het beheer van de pleegzorg.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – november 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er is een plan van aanpak ontwikkeld voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de pleegzorg voor de periode 2018 en verder.</li> <li>2. Accordering van dit plan van aanpak in september 2017</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opstellen uitvoeringskader Pleegzorg 2018. Hierin geven gemeenten aan hoe zij invulling geven aan jeugdhulp in gezinsvormen, en een actieplan.</li> <li>2. Per 2019 wordt de jeugdhulp opnieuw ingekocht. In de nieuwe overeenkomst jeugdhulp zullen we de uitgangspunten en actielijnen uit het te ontwikkelen uitvoeringskader Pleegzorg verwerken.</li> </ol>

<b>Project 3: Bovenregionale afstemming specialistisch aanbod</b>	
<b>RSA Spierpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein</li> <li>2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bovenregionaal aanbod ontwikkelt zich zoveel als mogelijk tot regionaal aanbod, dan wel; de kennis en expertise vanuit het bovenregionaal specialistisch aanbod wordt geïntegreerd in het regionaal aanbod.</li> <li>2. Een verantwoorde afbouw van specialistisch bovenregionaal aanbod.</li> <li>3. Een adequate bovenregionale afstemming voor specialistisch aanbod wat niet in aanmerking komt voor regionalisering.</li> <li>4. Bovenregionale afstemming rondom gecertificeerde instellingen.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gesprekken zijn gevoerd met de aanbieders in onze regio over mogelijkheden om minder door te verwijzen naar gespecialiseerde zorg buiten de regio.</li> <li>2. Ambtelijk en bestuurlijk is provinciaal overleg geweest over de afbouw van gespecialiseerde functies en de inkoop van gecertificeerde instellingen.</li> <li>3. In provinciaal verband (Noord Holland) is een programma van eisen opgesteld voor inkoop van gecertificeerde instellingen voor 2019.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De samenwerking in Noord Holland wordt komende maanden meer verstevigd.</li> <li>2. We brengen het aanbod en de wachtlijsten in kaart en verdelen waar mogelijk de accounthoudersschappen.</li> </ol>



## 7. Programma Bescherming & Opvang



Project 1: Sluitende aanpak bescherming en opvang	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.</li> <li>2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.</li> <li>3. Gezonde en vitale regio.</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bij problematiek als overlast, huiselijk geweld, kindermishandeling, verwardheid, dakloosheid, verslaving en psychische problemen is de gemeente als gesprekspartner in beeld.</li> <li>2. Er is sprake van één gezamenlijke sluitende aanpak met een passende inzet van zorg, ondersteuning en/of straf. Het is een aanpak op maat die mensen zo vroeg mogelijk, gericht en in samenspraak met de sociale omgeving ondersteunt op alle levensgebieden. Waar mogelijk ligt de regie van de aanpak bij de persoon zelf en zijn netwerk.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeenten, GGZ Centraal, Jellinek, Kwintes, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, De Waag, Regionale Ambulancevoorziening, Familie- en naastenvereniging Ypsilon en de Politie hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.</li> <li>2. Er is een subsidie aangevraagd en gehonoreerd van €234.000,-, bestemd voor de uitwerking en uitvoering van de beoogde aanpak rondom personen met verward gedrag.</li> <li>3. Er is een structuur ontwikkeld waarbinnen de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking rondom de sluitende aanpak plaatsvindt.</li> <li>4. Binnen het programma Bescherming en Opvang is er een specifieke aandachtfunctionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het borgen van het cliënt- en naastenperspectief bij de uitvoering.</li> <li>5. Er zijn werkafspraken gemaakt over de toewijzing van briefadressen aan dak- en thuislozen naar (regio)gemeenten tussen de gemeenten en met de afdelingen Burgerzaken.</li> <li>6. Voor professionals is er een beslisboom ontwikkeld voor het werkproces rondom de nazorg van ex-gedetineerde jeugdigen, in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen en het Veiligheidshuis.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laatste kwartaal van 2017 is er een concept Sluitende aanpak bescherming en opvang uitgewerkt, inclusief processen, rollen en verantwoordelijkheden en randvoorwaarden).</li> <li>2. Besluitvorming over concept sluitende aanpak eerste kwartaal 2018.</li> </ol>



<b>Project 2: Preventie en vroegsignalering</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.</li> <li>2. Gezonde en vitale regio.</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk tot een crisis leiden.</li> <li>2. Inwoners, de sociale omgeving en professionals voldoende toe te rusten om signalen van ernstige problemen tijdig te herkennen en erkennen.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Versterken van de deskundigheid van de uitvoerende medewerkers van gemeenten, Veilig Thuis, en aanbieders. Onder andere door de kennis van preventief werken breder uit te zetten door middel van bijeenkomsten en trainingen.</li> <li>2. Gemeenten en Veilig Thuis geven uitvoering aan de pilot 'versterkte procesregie'.</li> <li>3. Het preventie- en handavingsplan riskant alcoholgebruik is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein en ligt ter vaststelling voor bij de colleges.</li> <li>4. Evaluatie verwijzindex.</li> <li>5. De Regio heeft een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het op uitvoerend niveau verbinden van preventieve activiteiten die de GGD uitvoert en de preventieve activiteiten die de Regio uitvoert in het kader van Bescherming en Opvang.</li> <li>6. Met Jellinek (verslavingszorg) zijn afspraken gemaakt over de inkoop van preventie-activiteiten voor verslaving.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Versterken van een gezamenlijke beweging van partners in de keten om huiselijk geweld te voorkomen en bespreekbaar te maken. Dit doen we onder andere door in te zetten op deskundigheidsbevordering van uitvoerende medewerkers van gemeenten, Veilig Thuis en andere beroepsprofessionals in de keten.</li> <li>2. Het verder versterken van commitment bij beroepsprofessionals in de keten voor kinderen en zorgafhankelijken. Najaar 2017 gebruik van de verwijzindex door professionals bevorderen.</li> <li>3. Najaar 2017 stelt de Regio een functionaris in die de opdracht heeft om doorlopend toezicht uit te oefenen op het gebruik van de verwijzindex en om het gebruik van de index te bevorderen.</li> <li>4. Laatste kwartaal 2017 voorstellen en besluitvorming over de structurele uitvoering op basis van een eindevaluatie van de 'pilot versterkte procesregie'</li> <li>5. Vanaf 1 januari 2019 wordt de meldcode Huiselijk geweld/kindermishandeling aangescherpt. Regionale afstemming hierover start per september 2017. In het najaar van 2017 vindt analyse plaats van de impact van de aangescherpte meldcode op de uitvoeringdiensten van gemeenten en Veilig Thuis.</li> </ol>

<b>Project 3: Beschermd en veilig thuis wonen</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.</li> <li>2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.</li> <li>3. Gezamenlijke regie op sociale woningbouw.</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inwoners wonen zo lang als mogelijk en zo zelfstandig als mogelijk en beschermd thuis. Ook als er 24/7 toezicht nodig is.</li> <li>2. Inwoners krijgen passende ondersteuning vanuit een sterk Veilig Thuis om de veiligheid in de eigen leefomgeving te waarborgen.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er is een plan ontwikkeld en verder uitgewerkt met een werkgroep van aanbieders en ervaringsdeskundigen voor de uitvoering van de pilot 24/7 toezicht in de wijk. Het plan wordt najaar 2017 voorgelegd aan de wethouders ter besluitvorming. Het doel is een regionaal dekkend netwerk van 24/7 toezicht en ondersteuning in wijken om beschermd wonen thuis mogelijk te maken.</li> <li>2. Professionals van woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties zijn geconsulteerd over de verbetering van het huisvestingsbeleid voor mensen die slachtoffer of veroorzaker zijn van overlast, huiselijk geweld, verwardheid, dakloosheid, verslaving en psychische problemen. De input uit deze consultaties verwerken we in een aanpak voor huisvesting maatschappelijke doelgroepen.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. De actuele wachtlijst voor beschermd wonen in regio Gooi en Vechtstreek is geïnventariseerd.</li> <li>4. Momenteel werven we een wachtlijstbeheerder die vanuit de Regio wordt aangesteld.</li> <li>5. Met GGZ centraal en Jellinek (verslavingszorg) zijn afspraken gemaakt in het kader van zowel de inkoop van bemoeizorg in de wijk, als van consultatie en advies over mensen met GGZ en verslaving door professionals.</li> <li>6. Op 3 juni 2014 startte regionaal de pilot huisvesting maatschappelijke doelgroepen. Deze pilot wordt momenteel geëvalueerd. Hieruit volgt een voorstel over de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen in Gooi en Vechtstreek.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In het najaar van 2017 gaat de pilot 24/7 beschikbaarheid in de wijk van start.</li> <li>2. Voor de zomer van 2018 worden er 20 woningen gerealiseerd voor inwoners met zorgbehoefte.</li> <li>3. Op basis van de evaluatie van de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen volgen er in het laatste kwartaal van 2017 voorstellen over de huisvesting van deze doelgroepen.</li> <li>4. Begin november vindt ondertekening van contracten plaats met GGZ centraal en Jellinek voor bemoeizorg en consultatie en advies.</li> </ol>

<b>Project 4: Gebundelde ambulante crisiszorg 24/7</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.</li> <li>2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.</li> <li>3. Gezonde en vitale regio.</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Na een melding van (zorgen over) huiselijk geweld, verwardheid, psychiatrie, verslaving en aanverwante problematiek treedt de overheid adequaat op door de juiste hulp in te zetten en te zorgen dat de situatie niet verder escaleert.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – juni 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De crisisdienst voor jeugdigen is onderbracht bij Veilig Thuis. De capaciteit en deskundigheid zijn op orde.</li> <li>2. Veilig Thuis en gemeenten hebben over de toeleiding naar crisiszorg samenwerkingsafspraken gemaakt. Gemeenten en Veilig Thuis monitoren maandelijks de uitvoering van de samenwerkingsafspraken om de uitvoering daarvan continu te optimaliseren.</li> <li>3. Via het Regionaal Leerhuis zijn er kennissessies georganiseerd voor gemeentelijke consulenten en medewerkers van Veilig Thuis.</li> <li>4. Samen met de partners in de regio Utrecht is er een interdisciplinair risicotaxatie-instrument ontwikkeld voor personen met verward gedrag.</li> <li>5. Er zijn maatregelen getroffen om de veiligheid van de crisisopvang bij de Cocon verder te versterken.</li> <li>6. De positie van kinderen binnen de opvang bij de Cocon en het Oranjehuis is verstevigd door jeugdigen vanaf 12 jaar een eigen begeleider toe te kennen.</li> <li>7. Gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de GGZ crisisdienst en de Regionale Ambulance Voorziening voeren een haalbaarheidsstudie uit naar passend vervoer bij crisis in regio Gooi en Vechtstreek. Deze haalbaarheidsstudie is naar verwachting in oktober van dit jaar gereed.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De Regio werkt aan een snellere doorstroom naar residentiële plekken vanuit de crisisdienst jeugd.</li> <li>2. We zetten doorlopend in op een intensivering van de samenwerking tussen Veilig Thuis en het consultatie en adviesteam, en op het versterken van de deskundigheid van de uitvoerende medewerkers.</li> <li>3. In het laatste kwartaal van 2017 doen we een voorstel voor de inrichting van het crisisvervoer in Gooi en Vechtstreek. We beogen in het eerste kwartaal van 2018 de besluitvorming door colleges hierover af te ronden.</li> <li>4. Het risicotaxatie-instrument voor personen met verward gedrag wordt de komende tijd verder verfijnd, zodat de betrokken partijen in zorg en veiligheid er met ingang van 2018 mee kunnen werken.</li> <li>5. Onder regie en toezicht van de Regio zullen alle professionals in de Maatschappelijke Opvang die werken met kinderen per 2018 SKJ gecertificeerd zijn.</li> </ol>


Daarmee volgen we het Kwaliteitskader Jeugd waarin werkgevers wordt geadviseerd om voor het invullen van hbo-functies (en hoger) in te zetten op SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals wanneer sprake is van complexe en risicovolle handelingen.

6. In het najaar wordt gestart met het opzetten van een pilot voor gebundelde crisiszorg met de GGZ, Veilig Thuis, de Zorgverzekeraar en het Zorgkantoor. De pilot gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 van start.

<b>Project 5: Voldoende passende opvang</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.</li> <li>2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voldoende opvangcapaciteit voor vrouwen, dak en thuislozen.</li> <li>2. Voldoende capaciteit beschermd wonen.</li> <li>3. Een gedifferentieerd aanbod beschermd wonen.</li> <li>4. Het ontstaan van nieuwe beschermde woonvormen.</li> <li>5. Meer uitstroom van inwoners die gebruik maken van opvangplaatsen.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – juni 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In de contracten met aanbieders is uitbreiding van het aantal plaatsen voor beschermd wonen opgenomen. Doel is toename van de capaciteit.</li> <li>2. Tussen gemeenten, de Regio en aanbieders van beschermd wonen is een sluitende aanpak ontwikkeld binnen het proces van plaatsing en wachtlijstbeheer voor cliënten die vanuit de Wmo voor beschermd wonen in aanmerking komen. Deze procesuitwerking vormt voor uitvoerders een helder stappenplan op basis waarvan zij cliënten effectief kunnen toeleiden naar ondersteuning.</li> <li>3. De actuele wachtlijst voor beschermd wonen in regio Gooi en Vechtstreek is geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie stellen we vast dat de wachtlijst terugloopt. In 2015 stonden er 40 wachtenden op de wachtlijst, momenteel zijn dat er 28.</li> <li>4. We werven een wachtlijstbeheerder die ook bij de Regio een aanstelling krijgt.</li> <li>5. Om 20 woningen voor inwoners met zorgbehoefte te realiseren is een uitvraag uitgezet onder woningcorporaties. We willen hiermee meer alternatieven voor mensen creëren, naast het beschermd wonen.</li> <li>6. Er is regionaal een inkooptraject gestart voor de vrouwen- en daklozenopvang en de maatschappelijke zorg. Met dit traject worden de subsidierelaties die de gemeente Hilversum als centrumgemeente namens de regiogemeenten had, omgezet naar gecontracteerde zorg. Hiermee beogen we een structurele uitbreiding van plekken in de daklozenopvang Cocon. Tevens zijn er in dit kader afspraken gemaakt met de regio Amersfoort over het gebruikmaken van hun opvangcapaciteit bij zeldzame pieken.</li> <li>7. De pilot sociaal medische zorg is succesvol afgerond. De gezondheidsproblemen van daklozen zijn in kaart gebracht, er zijn aanbevelingen gedaan om mensen uit deze doelgroep toegang te geven tot huisartsen- en tandartsenzorg, en de sociaal medische kennis onder medewerkers van de Cocon is uitgebreid. Een voorstel om een verpleegkundige in te zetten voor diagnose en verwijzing volgt najaar 2017.</li> <li>8. Voor vrouwen en in hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld is in Almere het Oranje Huis per 7 juli geopend, met in oktober 2017 de officiële opening. Gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben samen met centrumgemeente Almere Het Oranje Huis binnen de gestelde tijdslijnen en middelen gerealiseerd.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voor de zomer van 2018 worden 20 woningen gerealiseerd voor inwoners met zorgbehoefte.</li> <li>2. Per oktober 2017 voert de Regio wachtlijstbeheer en de plaatsing beschermd wonen uit.</li> <li>3. Het inkooptraject voor de vrouwen- en daklozenopvang en de maatschappelijke zorg is in november a.s. afgerond. De overeenkomst voor deze zorg gaat per 2018 in.</li> <li>4. Dit najaar komt er een plan voor het scheiden van wonen en zorg binnen het beschermd wonen.</li> <li>5. Er komt een voorstel voor een daklozenopvang, in combinatie met een outreachende aanpak om de zwerfjongeren in de regio in beeld te krijgen, om vertrouwen te winnen en zo de toeleiding naar hulpverlening te bevorderen.</li> <li>6. We zetten de komende tijd in op verder terugdringen van wachtlijsten voor woningen en 24/7 ambulante aanbod. Dit doen we door de eerder genoemde uitbreiding van woningen, door wachtlijstbeheer en door scheiden van wonen en zorg.</li> </ol>

<b>Project 6: Positionering kinderschermingsmaatregelen, jeugdreclassering &amp; drang</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein</li> <li>2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Een effectieve inrichting en een passende positionering van kinderschermingsmaatregelen, jeugdreclassering & drang.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Maart 2017 - december 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	Gemeenten en Veilig Thuis geven uitvoering aan de pilot 'versterkte procesregie'. Doel van de pilot is het voorkomen van gedwongen hulpverlening aan jeugdigen door in samenwerking met het gezin (versterkte) procesregie te voeren. Binnen de pilot worden hiervoor de juiste randvoorwaarden bij de uitvoeringsdiensten gerealiseerd en zetten we in op deskundigheidsbevordering bij de uitvoerende medewerkers. Inmiddels heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden en is besloten de pilot tot eind 2018 voort te zetten.
<b>Voortgang en planning</b>	In het laatste kwartaal van 2018 nemen gemeenten besluiten over of, dan wel de mate waarin zij de versterkte procesregie zelf uitvoeren of uitbesteden aan derden. Eind 2018 volgt besluitvorming over de structurele invulling van 'versterkte procesregie'.

## 8. Programma Milieu & Duurzaamheid

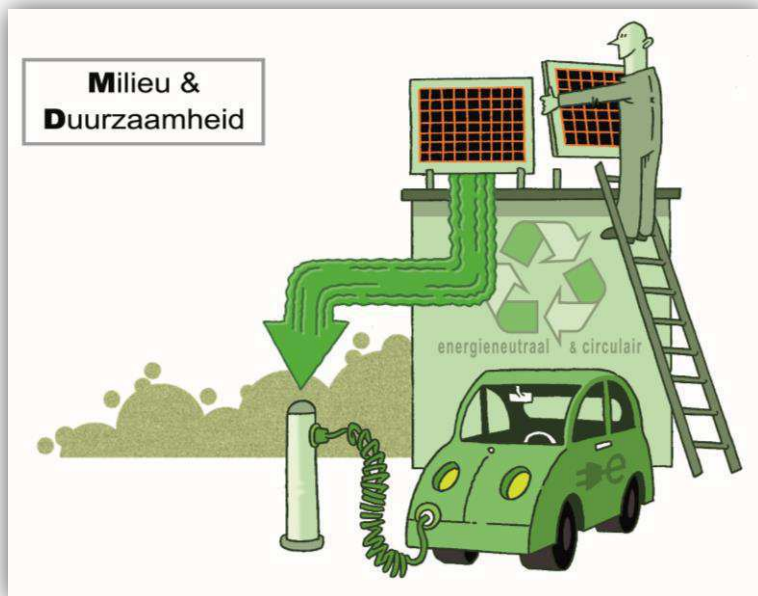

Project 1: Circulaire economie, werkgelegenheid & grondstoffentransitie	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Circulaire economie (CE)</li> <li>2. Economie, creatieve bedrijvigheid</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Een duurzame en circulaire regio 'Cirkelregio G&V 2050'
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben begin dit jaar het Nationaal grondstoffen akkoord ondertekend en nemen deel aan de landelijke transitieteams.</li> <li>2. In MRA verband (MRA programma Circulaire Economie) zijn Gooi en Vechtstreek en Lelystad trekker van het project 'verbeteren inzameling en verwerking'. Dit maakt deel uit van de ruimtelijke-economie actie agenda MRA.</li> <li>3. Marktverkenning en scenario's voor lokale kringloop Textiel G&amp;V is voltooid.</li> <li>4. Vertegenwoordigers van de regio(gemeenten) hebben deelgenomen aan circulair inkoop academie en Community of Practice 'circulair inkopen' MRA.</li> <li>5. Grondstoffen huishoudens &amp; openbare ruimte (zie VANG HHA en Buitenshuis).</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In MRA-verband wordt gewerkt aan het circulair maken van de Bouw en Sloopafvalstroom (start september 2017).</li> <li>2. Afstemming MRA deelregio's t.a.v. circulaire inkoop/ aanbestedingstrajecten voor aantal kansrijke stromen (o.a. bebording/ bewegwijzering recreatieve routes en dataservers) (eind 2017).</li> <li>3. In september start een onderzoek naar inzameling en verwerking PMD (Plastic, Metalen verpakkingen en Drinkenkartons), luiers en textiel. Resultaten volgen eind 2017.</li> <li>4. Uitwerking lokale sortering en werkgelegenheid rondom de textielstroom in business case 2<sup>e</sup> helft 2017.</li> <li>5. Strategie en routekaart Circulaire Economie Gooi en Vechtstreek: eind 2017.</li> </ol>

<b>Project 2: VANG Huishoudelijk Afval</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	1. VANG (Van afval naar grondstof) (Onderscheid wordt gemaakt tussen VANG Huishoudelijk afval (GAD) en VANG Buitenshuis (gemeenten))
<b>Wat willen we bereiken?</b>	75% gescheiden inzameling huishoudelijk afval in 2020
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Loopt tot en met 2020
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De uitrol van de PMD container en de kleinere restafval container in Laren, Blaricum en Huizen is afgerond.</li> <li>2. Vanaf 3 juli 2017 is ook de nieuwe inzamelkalender van kracht. Na invoering PMD container scheiden nu meer mensen PMD.</li> <li>3. De voorbereidingen en aanwijzingen voor de ondergrondse locaties is gestart.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na de zomer wordt de eerste uitrolfase uitgebreid geëvalueerd. Eind van 2017 zullen de eerste resultaten beschikbaar zijn voor de regio.</li> <li>2. Begin 2018 wordt gestart met uitrollen van het VANG-traject in Gooise Meren. De voorbereiding is al gestart.</li> </ol>

<b>Project 3: VANG Buitenshuis</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	1. VANG (Van afval naar grondstof) (Onderscheid wordt gemaakt tussen VANG Huishoudelijk afval (GAD) en VANG Buitenshuis (gemeenten))
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Groenatlas: Deze biedt inzicht in de aanwezige (groene) afval- en grondstoffen in Gooi en Vechtstreek en de kansen, op basis waarvan advisering over duurzame inzet, toepassing en verwerking in de (regionale) circulaire economie kan plaatsvinden.</li> <li>2. Integrale inzameling en hoogwaardige verwerking van PMD en biomassa.</li> <li>3. Bijdrage aan visie en strategie op grondstoffentransitie Gooi en Vechtstreek.</li> <li>4. Aanhaken op MRA-programma.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Vorbereiding gestart in 2016. Looptijd tot en met 2017.
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In MRA verband is een 'position paper' opgesteld richting het Rijk met betrekking tot de verruiming van wet- en regelgeving als het gaat om (integraal verzamelen) van bedrijfs (gemeentelijk)- en huishoudelijke afvalstromen.</li> <li>2. (Groene) grondstoffenatlas (wordt vertaald naar) is aangehaakt op het grondstoffenatlas-project MRA/ Provincie.</li> <li>3. Afstemmingstraject regiogemeenten m.b.t. PMD inzameling in de openbare ruimte (via prullenbak).</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In oktober wordt in MRA-verband een verzoek ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de verruiming van wet- en regelgeving als het gaat om (integraal verzamelen) van bedrijfs- en huishoudelijke afvalstromen.</li> <li>2. Mogelijke deelname in proeftuinen MRA 2018.</li> <li>3. Een grondstoffenatlas (groen en overige) wordt opgesteld voor hele MRA gebied in 2<sup>e</sup> helft 2017, waaronder Gooi en Vechtstreek.</li> <li>4. Business case regionale inzameling prullenbakken openbare ruimte (PMD en restafval) 2<sup>e</sup> helft 2017.</li> </ol>

<b>Project 4:</b>	<b>Energietransitie</b>
<b>RSA Speerpunt</b>	Duurzame energie
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Energie- klimaatneutraliteit (in 2030) door een regionale energiestrategie
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 - 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In maart 2017 is de subsidieaanvraag Beschermd gezichten (monumenten) bij VNG ingediend in het kader van Innovatieve aanpakken. Hoewel deze aanvraag uiteindelijk niet is gehonoreerd, wordt gewerkt aan een vergelijkbaar plan met alternatieve financiering.</li> <li>2. Eind september 2016 is een gezamenlijke aanvraag met de regio Eemland bij de VNG gehonoreerd voor een innovatieve aanpak voor VvE's. De uitvoering is in volle gang. In maart 2017 is de eerste regiobijeenkomst geweest voor VvE's. Daarna zijn er verschillende trainingen georganiseerd voor VvE-besturen en -leden. Er wordt een (digitaal en fysiek) platform opgericht van, voor en door VvE-leden. Via dit platform wordt op een laagdrempelige manier informatie onder VvE-leden uitgewisseld over onder andere het verduurzamen van het VvE-gebouw. Ook zijn er in Gooi en Vechtstreek een zestal Energiescans verloot onder VvE's. We selecteren momenteel VvE-koplopers om daadwerkelijk de gebouwen verdergaand te verduurzamen en zo modelgebouwen te creëren.</li> <li>3. Bij de VNG is succesvol zogenaamd 'overbruggingskrediet' aangevraagd voor de periode januari 2017 t/m de kabinetsformatie. Daarna wordt gezien of de huidige ondersteuningsstructuur vanuit de VNG wordt gehandhaafd.</li> <li>4. In 2016 en 2017 zijn gesprekken gevoerd met financiële instellingen en adviseurs over het opstellen van (lokale) financieringsarrangementen en het aantrekkelijk maken van de verduurzamingsopgave in deze regio voor bijvoorbeeld beleggers.</li> <li>5. Het regionaal energieloket (duurzaamloket.nl) is beschikbaar voor vragen van inwoners over verduurzamingsmaatregelen en het vinden van goede aanbieders hiervan.</li> <li>6. Onze partner van de wijkaanpak (Hoom) heeft intern een doorontwikkeling gemaakt. Recent is gebleken dat activiteiten niet worden doorgezet in de huidige vorm (intensief begeleiden klantreis en contractpartner-zijn voor inwoners). De nieuwe werkwijze, die zich meer richt op inzet van lokale energiecorporaties, wordt meegenomen in de regionale Energiestrategie.</li> <li>7. Er heeft in overleg met lokale communicatieadviseurs afstemming plaatsgevonden om de communicatieboodschappen te stroomlijnen.</li> <li>8. Er is gewerkt aan de oprichting van 035Energie (een coalitie van in eerste instantie lokale, aanbiedende partijen). De gemeenten spelen hierin een faciliterende rol door een adviseur aan te bieden en door ze mee te laten werken aan concrete projecten. De bal ligt momenteel bij de bedrijven of zij deze samenwerkingsvorm zien zitten. Najaar 2017 wordt een start gemaakt met hun mogelijke rol in de bovengenoemde VvE-aanpak.</li> <li>9. Er is een nieuw aanbod ontwikkeld voor Omgevingseducatie op basisscholen en het voortgezet onderwijs, samen met de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek</li> <li>10. In februari 2017 heeft het projectteam opdracht gekregen een regionale Energiestrategie en spoorboekje op te stellen (naar energie- en klimaatneutraliteit.. Gesprekken zijn gevoerd met stakeholders (zoals netbeheerders, woningcorporaties, Provincie, energiecoöperaties etc.)</li> <li>11. In juni en juli 2017 is met Provincie en regiogemeenten de warmtetransitie in beeld gebracht op wijkniveau. In de aanpak en ontwikkeling van de strategie werken wonen, ruimte en duurzaamheid nauw samen.</li> <li>12. Afstemming tussen regiogemeenten vindt plaats ten aanzien van aardgasloze nieuwbouw.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwijl de Regionale Energiestrategie wordt ontwikkeld 'blijft de winkel open'. Lopende projecten, zoals genoemd in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 worden uitgevoerd en/of slim ingepast in deze strategie.</li> <li>2. Afronding gespreksronde Werkateliers 'kansrijke projecten bestaande bouw' en 'aardgasvrije nieuwbouw' (najaar 2017).</li> <li>3. De bouwstenen vormen de basis voor de Regionale Energiestrategie en de</li> </ol>



verschillende routes naar energie- klimaatneutraliteit. De energiestrategie is eind 2017 gereed.

4. Op 24 november 2017 vindt een regionale energieconferentie plaats voor en met gemeenten(raden) en de bij de energietransitie betrokken stakeholders.

## 9. Programma Dienstverlening

<b>Project 1: Doorontwikkeling regionaal Leerhuis</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein</li> <li>2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg</li> <li>3. Gezonde en vitale regio Gooi en Vechtstreek</li> <li>4. Inclusieve arbeidsmarkt</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een versterking van het leeraanbod van het regionaal leerhuis.</li> <li>2. Besluitvorming over het al dan niet voortzetten van het regionale leerhuis.</li> <li>3. Bij voortzetting van het regionaal leerhuis: een passende constructie waarbinnen dit plaatsvindt.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deelnemers aan het Regionaal Leerhuis beoordelen de kennissessies over het algemeen als zeer goed. Extra inspanning is nodig om een ander doel te realiseren, namelijk een aansprekend aanbod voor bestuurders en beleidsambtenaren van gemeenten, en voor vertegenwoordigers van inwoners en cliënten en aanbieders en partners binnen het sociaal domein.</li> <li>2. Voor doorontwikkeling van het Regionaal Leerhuis werken we momenteel een voorstel uit.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	Bij de toekomstige inrichting van het Regionaal Leerhuis willen we een bredere doelgroep aanspreken, en ook aanbod ontwikkelen voor het fysieke domein. Dit laatste door thema's als de Omgevingswet, circulaire economie en duurzaamheid te agenderen. Om dat concreet te maken doen we voor de periode 2018 en verder een voorstel in het portefeuillehoudersoverleg van november 2017.

<b>Project 2: Convenant Gezonde en Vitale Regio</b>	
<b>RSA Speerpunt</b>	Gezonde en Vitale Regio
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een effectieve uitvoering van het convenant Gezonde en Vitale Regio waarmee gemeenten, de Regio en Tergooi zich inzetten voor 'positieve gezondheid' in Gooi en Vechtstreek.</li> <li>2. Netwerk Goed en Gezond Leven verbinden aan het convenant.</li> <li>3. Implementatie brede leefstijlaanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) waarbij op lokaal/regionaal niveau wordt samengewerkt.</li> <li>3. Versterken van de samenwerking tussen het fysiek en het sociaal domein, waarbij gezondheid een volwaardige plaats inneemt bij de afweging van keuzes in het kader van de fysieke inrichting.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Maart 2017 – december 2020
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Convenant Gezonde Vitale Regio is op 22 maart 2017 ondertekend door bestuurders Tergooi en regiogemeenten en eindigt op 31 december 2020 (met mogelijkheid tot verlenging). Het eerste concept-actieplan van het convenant is klaar en de volgende projecten zijn benoemd.</li> <li>2. Doorontwikkeling regionaal Netwerk Goed en Gezond Leven: waar voorheen samengewerkt werd binnen verschillende domeinen is het Netwerk Goed en Gezond Leven ontstaan.</li> <li>3. Het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is bij de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Huizen van start gegaan. De deelnemende gemeenten zetten zich in voor een gezonde samenleving en een omgeving waarin een gezonde leefstijl normaal is en waarin het voor mensen makkelijker is om gezonde keuzes te maken.</li> <li>4. Om gezondheidsaspecten (bevordering en bescherming) nadrukkelijker mee te wegen bij bestuurlijke beslissingen is onder meer een Kadernotitie inzake relatie fysieke inrichting en gezondheid geaccordeerd door PFHO Sociaal Domein. De notitie is gepresenteerd bij ambtenaren fysiek en sociaal domein van alle regiogemeenten en bij PFHO Fysiek domein. Ook is deelgenomen aan regionaal overleg inzake Omgevingsvisie.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zorg zal steeds meer ambulante worden georganiseerd, dichtbij inwoners en als het kan thuis. Het ziekenhuis, de basis medische zorg en de gemeentelijke zorg zullen de</li> </ol>

zorgverlening dan ook steeds meer sámen met de inwoner invullen. Hoe pakken we dat aan in onze regio? Die vraag staat centraal tijdens het Gezondheidsfestival 'de toekomst van uw zorg' op 28 september 2017.

2. Het actieplan behorende bij het Convenant Gezonde Vitale Regio wordt als volgt uitgevoerd:
  - a. Positieve Gezondheid dragen we langs diverse lijnen uit: van agendasetting bij organisaties en het stimuleren om zelf aan de slag gaan om hun cliënten vanuit de invalshoek van Positieve Gezondheid te ondersteunen, tot vorming van een netwerk om ervaringen/successen te delen, en tot slot door het thema ook bij inwoners onder de aandacht te brengen.
  - b. Inwonerportaal/KiesZO: Lancering op 28 september 2017. Andere organisaties worden uitgenodigd om aan te sluiten via PAZIO.
  - c. Integrale (transmurale)zorg: in 2<sup>e</sup> helft 2017 stellen we een werkgroep in om een zorgpad transmurale zorg te ontwikkelen.
  - d. Regionaal Leerhuis Plus: in de 2<sup>e</sup> helft 2017 onderzoeken we de samenwerkingsmogelijkheden en kansen om programma's op elkaar af te stemmen.
  - e. Zorgverlening ADHD en Zorgverlening Jeugdpsychiatrie: 3<sup>e</sup> kwartaal 2017 onderzoekt Tergooi of aansluiten op de verwijsindex mogelijk is.
3. Netwerk Goed en Gezond leven wordt op termijn onderdeel van het convenant. De bedoeling is dat er ook andere partijen aansluiten.
4. Uitvoering van lokale plannen van de JOGG-aanpak vindt plaats bij de drie deelnemende gemeenten.
5. Continuëren van de deelname aan regionale/lokale overleggen, zodat we verbinding tot stand brengen tussen fysieke omgeving en effecten op gezondheid.

<b>Project 3: Evaluatie en doorontwikkeling bestuursopdracht JEUGDslag</b>	
<b>RSA Speerpunt</b>	Gezonde en vitale regio
<b>Wat willen we bereiken?</b>	Een adequate bestuursopdracht 2018-2022 voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. Dit op basis van ervaringen en verbeterpunten uit de periode 2014-2018.
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	September 2017 – juni 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uit evaluatie van de bestuursopdracht JEUGDslag 2014-2018 blijkt dat de doelstelling is gerealiseerd.</li> <li>2. Gemeenten en Jeugd en Gezin hebben voor de tweede helft van 2017 speerpunten geformuleerd om behaalde resultaten in te bedden in toekomstige uitvoering. Dit legt meteen de basis voor ontwikkeling en implementatie van JEUGDslag 2.0 (een nieuwe bestuursopdracht voor de periode 2018-2022). De speerpunten hebben betrekking op:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een duidelijke communicatie op basis van een sterke identiteit.</li> <li>- Het creëren van een sluitende aanpak tussen partijen in de keten.</li> <li>- Een grotere vervaechting met dienstverlening/processen van gemeenten.</li> </ul> </li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In de tweede helft van 2017 geven we uitvoering aan de door gemeenten geformuleerde speerpunten. Dit vormt tevens de aanloop naar de nieuwe bestuursopdracht.</li> <li>2. Naar verwachting bieden we de nieuwe bestuursopdracht eind 2017 ter vaststelling aan bij de colleges.</li> <li>3. Begin 2018 start de implementatie van JEUGDslag 2.0.</li> </ol>

<b>Project 4: Evaluatie van het consultatie en adviesteam</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezonde en vitale regio</li> <li>2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisatie en versterking van de dienstverlening van het consultatie en adviesteam.</li> <li>2. Besluitvorming over het al dan niet voortzetten van het consultatie en adviesteam.</li> <li>3. Bij voortzetting van het consultatie en adviesteam: een passende constructie waarbinnen de voortzetting plaatsvindt.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – juni 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het consultatie en adviesteam van Regio Gooi en Vechtstreek bestaat nu ruim twee jaar. De Vrije Universiteit Amsterdam voert momenteel een effectiviteitsonderzoek en evaluatie uit.</li> <li>2. Er is een kosten-baten analyse uitgevoerd naar de taken van het consultatie en adviesteam. De analyse ronden we momenteel af, zodat de uitkomsten als input kunnen dienen voor de begroting van 2018.</li> <li>3. In juni 2016 hebben colleges besloten om met de nieuwe inrichting van de Jeugd GGZ het consultatie en adviesteam een steviger functie te geven op de volgende onderdelen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beoordeling van alle verlengingen binnen de Jeugd GGZ.</li> <li>b. Toezicht op kwaliteit van uitvoering aanbieders.</li> <li>c. Toezicht op kwaliteit en effectiviteit van hulpverleningsplannen.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In het najaar van 2017 leggen we de kosten-baten analyse van het consultatie en adviesteam voor aan de stuurgroep 18-.</li> <li>2. Het effectiviteitsonderzoek en de evaluatie ronden we in oktober 2018 af. Op basis van de rapportages die hieruit volgen zullen we voorstellen doen voor de structurele inbedding en doorontwikkeling van het consultatie en adviesteam.</li> </ol>

<b>Project 5: Inbedding toeleiding ernstige enkelvoudige dyslexie</b>	
<b>RSA Speerpunt</b>	Gezamenlijke regievoering bij maatschappelijk en complexe zorg
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisatie en versterking van de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie.</li> <li>2. Een passende constructie en structuur waarbinnen de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie plaatsvindt.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – juni 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De planning van dit project is aangepast. Het project gaat in september 2017 van start. Dan wordt gestart met de evaluatie van de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De evaluatie van de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie start met een evaluatiebijeenkomst met scholen, in september.</li> <li>2. In december zijn er voorstellen gereed over de structurele inbedding en doorontwikkeling van de toeleiding van ernstige enkelvoudige dyslexie. Naar verwachting is de besluitvorming hierover eind 2017/ begin 2018 afgerond.</li> </ol>

<b>Project 6: Doorontwikkeling Regionale Meld en Coördinatiefunctie</b>	
RSA Speerpunt	Onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg verbinden
Wat willen we bereiken?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisatie en versterking van de dienstverlening van de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC), zodat (potentiële) voortijdige schoolverlaters adequaat gekoppeld worden aan een onderwijs- of arbeidstraject.</li> <li>2. Een nadrukkelijke verbinding tussen de dienstverlening van de RMC en het Werkgeversservicepunt.</li> <li>3. Een passende constructie en structuur waarbinnen de RMC integraal en dichtbij de lokale uitvoeringsdiensten, het Werkgeversservicepunt en het Jeugd en Gezin-team kan functioneren.</li> </ol>
Beoogde start-/einddatum	Januari 2017 – december 2017
Resultaten tot nu toe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL; leerplicht en RMC) heeft haar dienstverlening integraal ingericht, zodat (potentiële) voortijdige schoolverlaters beter en meer effectief ondersteund kunnen worden: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Er bestaat geen knip meer tussen consulenten die voor jongeren van onder/boven de 18 jaar werken. De dienstverlening is ingericht op een doorlopende lijn voor jeugdigen van 5 t/m 23 jaar en bijna alle collega's richten zich zowel op 18min- als 18plus- leerlingen.</li> <li>b. Er is gewerkt aan een sluitende aanpak tussen gemeenten en onderwijsinstellingen. Zie ook de toelichting bij het project 'Verbinding arbeidsmarkt, onderwijs en jeugdzorg'. Hiervoor heeft het RMC haar werkprocessen herzien, zodat er een betere aansluiting is bij de processen van gemeenten en onderwijsinstellingen. Tevens werken gemeenten en het RBL op casusniveau samen bij het inzetten van passende vervolgtrajecten voor Voortijdig Schoolverlaters die richting arbeid begeleid moeten worden.</li> <li>c. Het RMC voert het 'Bankzittersproject' uit. Met dit project worden jongeren die niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering hebben actief en outreachend benaderd door medewerkers van het RMC.</li> <li>d. Binnen het project voortijdig schoolverlaten is speciaal aandacht voor kwetsbare jongeren (van het voortgezet speciaal onderwijs, de praktijkschool en de Entree opleiding van het mbo en de laagste niveaus van het vmbo).</li> <li>e. Het RMC maakt deel uit van het Netwerk Match op Meedoen waarin partners vertegenwoordigd zijn vanuit onder andere de lokale uitvoeringsdiensten, scholen, WSP, UWV, Mee en re-integratiebureaus.</li> </ol> </li> <li>2. Na een inventarisatie is de dienstverlening van het Regionale Meld en Coördinatiefunctie en het Werkgeversservicepunt beter op elkaar afgestemd, onder meer als het gaat om kennisoverdracht, processen, informatie-uitwisseling en afstemming op casusniveau tussen professionals.</li> <li>3. Door de maatregelen zoals genoemd onder 1 en 2 sluit de dienstverlening van het RBL, die van gemeentelijke uitvoeringsdiensten en het Werkgeversservicepunt beter op elkaar aan.</li> </ol>
Voortgang en planning	De komende periode blijven we investeren in verdere integraliteit van de dienstverlening van het RBL, de uitvoeringsdiensten, het Werkgeversservicepunt, het Jeugd en Gezin-team en het onderwijs. Ook zullen we, bijvoorbeeld via het Netwerk Match op Meedoen en via de casus-overleggen, de samenwerking tussen de partijen versterken.

<b>Project 7: Afstemming over de integratie en participatie van statushouders</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezonde en vitale regio.</li> <li>2. Inclusieve arbeidsmarkt.</li> <li>3. Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uitwisseling tussen gemeenten over de uitvoering van lokale programma's en projecten ten behoeve van de integratie en participatie van statushouders.</li> <li>2. Inzicht in activiteiten die partijen – al dan niet gecontracteerd/gesubsidieerd – ondernemen t.b.v. de participatie en integratie van statushouders.</li> <li>3. Regionale afstemming over en - waar mogelijk en wenselijk - harmonisering van lokale afspraken met derden (zoals Vluchtelingenwerk).</li> <li>4. De inbedding van inzet van vrijwilligers/vrijwilligersinitiatieven binnen reguliere structuren. Onder andere zodat de opgedane kennis in de Crailo-fase op een goede manier wordt overgebracht.</li> <li>5. Vaste aanspreekpunten met betrekking tot de gezondheid, integratie en participatie van statushouders.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – juni 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Landelijk lopen er twee ondersteuningsprogramma's gericht op de gezondheidsbevordering en integratie/werktoeleiding van statushouders. Als Regio hebben we van dit ondersteuningsprogramma gebruik gemaakt en zijn er drie regiocoördinatoren statushouders aangesteld. Zij hebben de opdracht om voor de gezondheidsbevordering, integratie en werktoeleiding van statushouders een regionale aanpak te ontwikkelen en over deze thema's afstemming en uitwisseling tussen ketenpartijen te organiseren. Hun functie wordt volledig door het Rijk gefinancierd.</li> <li>2. De uitwisseling tussen gemeenten, COA, vluchtelingenwerk en andere ketenpartners hebben we georganiseerd door een regionale werkgroep statushouders in te stellen.</li> <li>3. Om te komen tot een sluitende aanpak bij de opname van statushouders in gemeenten zijn de processen en samenwerkingsafspraken bij/tussen gemeenten, COA en vluchtelingenwerk in kaart gebracht en is geïnventariseerd op welke vlakken er verbeteringen door te voeren zijn. Onder andere de behoefte aan een vast aanspreekpunt kwam hierbij duidelijk naar voren.</li> <li>4. Pharos/VNG heeft vier Syrische statushouders uit de regio opgeleid in het adequaat informeren van statushouders en instanties met betrekking tot de persoonlijke situatie van statushouders en regelingen/ondersteuning waar zij aanspraak op kunnen maken.</li> <li>5. In regionaal verband heeft er een TBC-screening plaatsgevonden voor statushouders uit risicolanden.</li> <li>6. De GGD heeft bijeenkomsten georganiseerd voor statushouders over algemene gezondheidszorg en seksuele relaties.</li> <li>7. In overleg met Jeugd en Gezin wordt gesproken over het vormen van een expertise-team statushouders. De consultatie-sprekuren met statushoudersgezinnen nemen gemiddeld meer tijd in beslag, onder meer door taalbarrière en complexe problematiek</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De komende tijd geven we verder invulling aan het ontwikkelen van een sluitende aanpak in de statushoudersketen, onder meer door uitwisseling tussen partijen te organiseren en door werkprocessen op elkaar aan te laten sluiten.</li> <li>2. Mede op basis van het haalbaarheidsonderzoek over het internationaal onderwijs worden in het eerste kwartaal van 2018 besluiten genomen over of en in welke mate het internationaal onderwijs in de regio wordt versterkt.</li> </ol>

<b>Project 8: Verlengingen overeenkomsten sociaal domein</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein</li> <li>2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg</li> </ol>
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een verlenging van overeenkomsten in het sociaal domein onder eventueel geactualiseerde condities.</li> <li>2. Beschikbaarheid van passende maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	September 2017 – februari 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	Per 1 februari 2018 loopt de huidige overeenkomst met Otolift van rechtswege af. Daarom zijn wij – in regionaal verband- gestart met een inkooptraject voor de levering van trapliften, plateauliften en woonhuisliften. We hebben samen met aanbieders en inwoners gewerkt aan een offerteaanvraagdocument, waarin de eisen voor de levering van trapliften, plateauliften en woonhuisliften verwerkt staan. Op 6 september 2017 is het aanvraagdocument openbaar gemaakt via <a href="http://www.aanbestedingskalender.nl">www.aanbestedingskalender.nl</a> . Tot 18 oktober 2017 kunnen aanbieders reageren en zich inschrijven voor de uitvoering van deze opdracht.
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Op 1 december 2017 wordt de overeenkomst met de (nieuwe) leverancier(s) van trapliften, plateauliften en woonhuisliften ondertekend. Deze overeenkomst gaat per 1 februari 2018 in. Bij de uitvoering van deze overeenkomst houdt de afdeling Inkoop en Contractbeheer van de Regio toezicht op de uitvoering van de overeenkomst.</li> <li>2. In het najaar van 2017 starten we met de verlengingen/vervolginkooptrajecten voor Woningaanpassingen, en voor Compensatie Huishoudelijke Taken (Huishoudelijke Hulp),</li> </ol>

<b>Project 9: Verkenning subsidiebureau</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	N.a.v. aangenomen moties van gemeenteraden binnen regio Gooi en Vechtstreek.
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inzicht in de kansen en mogelijkheden in regio Gooi en Vechtstreek om t.b.v. de gezamenlijke uitvoering van taken en activiteiten in het fysiek en sociaal domein, aanspraak te maken op regionale, landelijke en Europese subsidies.</li> <li>2. Het indienen van subsidieaanvragen t.b.v. de gezamenlijke uitvoering van taken en activiteiten in het fysiek domein en het sociaal domein.</li> <li>3. De toekenning van regionale, landelijke en/of Europese subsidies waarmee gezamenlijke taken en/of activiteiten in het fysiek domein en het sociaal domein kunnen worden bekostigd.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – juli 2017
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De Regio heeft een aanpak voorgesteld en regionaal afgestemd met als hoofdvraag hoe bestaande subsidies en fondsen beter benut kunnen worden.</li> <li>2. Conform het plan van aanpak, is door Bureau Vindsubsidies in januari 2017 een quick scan gemaakt van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 van de Regionale Samenwerking Agenda (RSA). Het screeningsrapport laat op projectniveau RSA zien welke subsidiemogelijkheden het meest kansrijk zijn en wie ze kunnen aanvragen (Regio, gemeenten, regionale partners). Daarbij is een zo breed mogelijke aanpak gekozen, zodat zowel de publieke als de particuliere subsidiemogelijkheden aan bod komen.</li> <li>3. Onder leiding van Bureau Vindsubsidies zijn workshops georganiseerd om subsidies aan te vragen, om de subsidie binnen te halen, maar ook om ervaring te krijgen met het proces van subsidie- en fondsaanvragen.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	De screening en de opgedane ervaring maken het mogelijk om goed gefundeerd te adviseren over de organisatie van subsidievererving in de regio. Het advies wordt op dit moment opgesteld. Inzet is om dit najaar het advies aan te bieden voor behandeling.

<b>Project 10: Dierenwelzijn</b>	
<b>RSA Speerpunt</b>	Dierenwelzijn
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het hebben van één regionaal aanspreekpunt voor gemeenten, aanbieders en andere belanghebbenden voor dierenwelzijn.</li> <li>2. Afstemming en coördinatie van regionale initiatieven en werkwijzen rondom dierenwelzijn.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	Er is sprake van een regionaal projectleider die als aanspreekpunt fungeert voor gemeenten, aanbieders en andere belanghebbenden voor dierenwelzijn. Deze projectleider coördineert de regionale afstemming rondom dierenwelzijn.
<b>Voortgang en planning</b>	Op lokaal niveau en in regionaal verband zijn er afspraken gemaakt over de uitvoering van (wettelijke) taken op het gebied van dierenwelzijn. Deze afspraken zijn in regionaal verband vastgelegd en worden momenteel uitgevoerd. De huidige afspraken lopen in ieder geval tot en met 2018. In 2018 wordt bekeken of de afspraken op dezelfde wijze kunnen worden gecontinueerd, dan wel om bijstelling vragen. In de tussentijd is de coördinatie en afstemming regionaal georganiseerd en hebben gemeenten, aanbieders en andere belanghebbenden voor dierenwelzijn één regionaal aanspreekpunt.

<b>Project 11: Samenkracht! 2.0</b>	
<b>RSA Speerpunten</b>	Overkoepelend: systematische en gestructureerde samenwerking met inwoners en cliënten in het sociaal domein (op termijn ook fysiek domein), zodat projecten in het uitvoeringsprogramma inspelen op vragen, problemen en opgaven die leven bij inwoners.
<b>Wat willen we bereiken?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het bij de uitvoering van regionale projecten zichtbaar maken van het perspectief van inwoners.</li> <li>2. De behoeften van inwoners en cliënten sturend laten zijn in hoe regionale programma's en projecten worden uitgevoerd, zodat we borgen dat de resultaten van regionale projecten maximaal aansluiten bij de vragen en behoeften van inwoners.</li> <li>3. Realiseren dat uitvoerders van regionale projecten standaard werken vanuit de vraag van inwoners.</li> </ol>
<b>Beoogde start-/einddatum</b>	Januari 2017 – december 2018
<b>Resultaten tot nu toe</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>0. Het Plan van aanpak Samenkracht! 2017 is vastgesteld. Met dit plan geven de gemeenten en de Regio invulling aan Samenkracht! 2.0.</li> <li>1. Per project uit het Uitvoeringsprogramma is onder meer inzichtelijk gemaakt welke input we van inwoners en gebruikers van voorzieningen ophalen, met welk doel, en op welke manier we input verzamelen en gebruiken.</li> <li>2. De samenwerkingsafspraken en de werkwijze zijn uitgewerkt en gepubliceerd op de website van de Regio.</li> <li>3. Bij minimaal de helft van de projecten geven we ervaringsdeskundigen uit de betrokken doelgroepen een rol in het organiseren en regisseren van</li> <li>4. Inwonerbetrokkenheid bij regionale programma's en projecten.</li> </ol>
<b>Voortgang en planning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Met ingang van 2018 wordt het voor inwoners mogelijk om via de Regio-website berichten achter te laten over projecten die op grond van het regionaal Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.</li> <li>2. De aanpak Samenkracht! wordt doorlopend uitgevoerd en gemonitord.</li> <li>3. Verbreding van de scope van Samenkracht!, naast sociaal domein ook fysiek domein.</li> <li>4. Medio 2018 evaluatie van Samenkracht!. Op basis hiervan volgen verbetervoorstellen.</li> </ol>



## Financieel

De begroting 2017 voor het uitvoeringsprogramma bedraagt €2.554.550. Hiervan wordt €1.415.123 gedekt uit BWS-middelen en € 1.139.427 door subsidies van derden/cofinanciering.

### Inkomsten

Door het Algemeen Bestuur van de Regio is €500.000 beschikbaar gesteld - uit de bestemmingsreserve regionale samenwerkingsagenda - om voortgang te kunnen boeken bij de uitvoering. Besluitvorming over de resterende bestemmingsreserve van €1.700.000 staat gepland voor het najaar 2017.

De subsidies van derden/cofinanciering is nog niet volledig door de Regio ontvangen. Bij cofinanciering zijn de volgende aspecten van belang:

1. Een deel van de middelen die bij de subsidies van derden/cofinanciering zijn opgenomen, komt niet daadwerkelijk bij de Regio binnen. De overheveling van deze middelen is op een andere manier georganiseerd, of de middelen worden bij een andere partij op de rekening gestort. Een voorbeeld hiervan is de subsidie van het Mondriaanfonds; deze subsidie wordt aan het Singer Museum overgemaakt.
2. De subsidie 'RAP, cofinanciering subsidie provincie' van €62.800 in 2017 en 2018 is foutief opgenomen. Dit heeft geen consequenties voor de uitvoering van het project.
3. De subsidie ZonMw voor het Consultatie & adviesteam Jeugdwet van €198.000 in 2017 is met een foutief bedrag opgenomen. De correcte bedragen zijn voor 2016 €9.660, voor 2017 €12.880, en voor 2018 €9.660.
4. Van ZonMw is een subsidie ontvangen van €233.600 voor het project 'Echte betrokkenheid, wederzijdse afhankelijkheid. Plan van aanpak personen met verward gedrag 2017-2018'. Deze subsidie is nog niet verwerkt in het totaaloverzicht subsidies van derden/cofinanciering.
5. Voor de omgevingsvisie wordt nog een subsidie verwacht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van €30.000. Deze is nog niet opgenomen in het overzicht.
6. Als subsidie van derden/cofinanciering is voor toekomstbeeld landschap een subsidie van de provincie van €20.000 opgenomen en een cofinanciering van €25.000 uit de BWS-middelen. Deze subsidieregeling is nog niet geopend.

### Uitgaven

Na een half jaar bedraagt de realisatie van uitgaven (inclusief verplichtingen) €425.000,-. Een groot deel van de uitgaven moet nog plaatsvinden. Daarnaast is de verwachting dat de financiering van een deel van de projecten pas in 2018 plaatsvindt.

### Resultaat

Het uitgegeven bedrag van €425.000 past binnen het door het Algemeen Bestuur beschikbaar gestelde bedrag van €500.000. Besluitvorming over de resterende bestemmingsreserve op korte termijn is echter noodzakelijk omdat meer uitgaven gepland zijn. Deze besluitvorming vindt plaats in het najaar van 2017.

Ten aanzien van de cofinanciering kan geconcludeerd worden dat het 50-50 criterium nog steeds gerealiseerd wordt.
