



GAD
Gooi en Vechtstreek

Voortgangsrapportage II: Uitvoering VANG

Van Afval Naar Grondstof Gooi en Vechtstreek 2015 – 2020



INHOUD

Inleiding	1
Wat is er gebeurd tot nu toe?	1
Realisatie	2
Ervaringen	2
Resultaten	3
Bijsturen in de uitvoering	5

Ons kenmerk	18.0010584
Datum	November 2018
Contactpersoon	Daniël Walkot
E-mail	d.walkot@gad.nl

Inleiding

Hierbij treft u aan de 2^e voortgangsrapportage van 2018 van het Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020.

In 2015 stelden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren met de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD) het **regionaal uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 (VANG)** op. Met dit plan geven de gemeenten invulling aan de landelijke ambities om te komen tot meer hergebruik van huishoudelijke afvalstromen en minder restafval. De doelstelling voor huishoudens in Gooi en Vechtstreek is 75% hergebruik in 2020, bekrachtigd door de gemeenteraden met de vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018.

Note: De resultaten tot nu toe zijn gebaseerd op een deel van de uitrol VANG. Het effect van een half jaar uitrol laagbouw in Huizen, Laren en Blaricum wordt steeds meer zichtbaar in de regionale cijfers. De afvalscheidingsresultaten van de uitrol van de minicontainer in 2018 in de rest van de regio zijn nog niet meetbaar, de transitie is nog in volle gang.

Wat is er gebeurd tot nu toe?

2016	het regionaal uitvoeringsplan vastgesteld
2016	het plan voor de stadscentra in Hilversum en Naarden Vesting in uitvoering gekomen.
2017	in Huizen, Laren en Blaricum (fase 1) zijn de wijzigingen voor de laagbouw gerealiseerd. Voor de hoogbouw is het plan in uitvoering.
2018	zijn de mini-containers voor pmd uitgezet en de restafvalcontainers omgewisseld in Gooise Meren, Hilversum, Wijdmeren en Weesp (loopt t/m jan 2019).
2018	hebben de inwoners grote of meer grondstof-containers aan kunnen vragen en zijn deze geleverd.
2018	is in Huizen, Laren en Blaricum gestart met het plaatsen van de ondergrondse voorzieningen.
2018	is het projectplan voor fase 2 (Gooise Meren) ondergrondse verzamelcontainers afgerond (moet nog vastgesteld worden) en wordt er gestart met de participatie.

Realisatie

Uitrol laagbouw met ruimte

- 77.000 pmd-containers uitgezet
- 77.000 restafval-containers van 240 liter gewisseld naar 140 liter
- 7.150 grondstofcontainers zijn uitgezet/ gewisseld.
- Per 1 januari 2019 aanpassing van de inzamelfrequenties in de gehele regio

Uitrol hoogbouw en centra zonder ruimte

- Hilversum centra: 29 van de 47 locaties zijn gereed, 80% is in 2018 geplaatst. Voor de aanpak van de Gijsbrecht van Amstelstraat (apart onderdeel van het Hilversum centrumplan) geldt dat alle containers zijn geplaatst en dat hier gestopt is met de zakkeninzameling.
- Naarden Vesting: alle 6 locaties voor ondergrondse containers geplaatst. De zakkeninzameling is hier ook gestopt.
- Huizen, Laren en Blaricum: de locatieplannen zijn vastgesteld en er is gestart met het plaatsen van ondergrondse containers. In Huizen zijn 72 locaties van de 103 vastgesteld. Totaal zijn 44 van 136 locaties geplaatst.
- In Goioise Meren is het projectplan opgesteld en is een eerste opzet van het locatieplan gemaakt.

Communicatie

Om inwoners te betrekken en te informeren zijn de volgende communicatie activiteiten verricht:

- Campagne 'Afwal is geschiedenis, grondstoffen zijn de toekomst'
- Campagne 'doe mee met PMD'
- Lokale maatwerk uitingen over de wijzigingen van inzameling voor inwoners: informatiebijeenkomsten, brieven, voorlichting op markten en in wijken,
- Participatiebijeenkomsten voor de ondergrondse containers
- Inzet mobiele scheidingsstation is uitgebreid
- Publiciteit in online en offline media
- Open dag GAD op 6 oktober 2018



Ervaringen

Algemeen

Door het uitzetten van de minicontainers en het aanpassen van de inzamelfrequenties in fase 1 (Huizen , Laren ,Blaricum) zien we verbeterde afvalscheiding aan huis. Tegelijkertijd groeit de bewustwording van afval als grondstof. Van de inwoners werd een grote verandering gevraagd in een korte tijd. Het succes van de afvalscheiding is mede te danken aan hun drive en inzet. Er is behoefte aan duidelijke informatie over *wat* er in *welke* bak moet. De ervaringen die opgedaan zijn in fase 1 zijn toegepast in de uitrol van mini-containers in de rest van de regio.

Uitrol minicontainers

- voor inwoners verdwijnt de vrijblijvendheid van het scheiden van plastic, metalen en drinkverpakkingen bij de uitrol van de pmd-container;
- Vooraf is aan inwoners gevraagd of zij een grotere container voor andere grondstoffen (gft, papier) willen. Totaal zijn er na de zomer van 2018 4150 grondstoffencontainers (gft en papier) uitgezet.

- In het voorjaar zijn de pmd- containers uitgezet, in het najaar zijn de rest-afvalcontainers omgewisseld (240l ⇔ 140l). Per 1 januari 2019 wordt in de rest van de regio de nieuwe inzamel frequenties ingesteld. Hiermee is meer tijd genomen om de inwoners te laten wennen aan de veranderingen.
- Door vooraf al te inventariseren welke maat containers pmd men wilde, is er nu achteraf minder gewisseld. In totaal hebben 6170 huishoudens een 140 liter pmd aangevraagd, 1425 huishoudens hebben aangegeven geen pmd container te willen ontvangen. Deze huishoudens brengen zelf hun pmd naar wijkcontainers en of de scheidingsstations.

Hoogbouw, centra

Bij de uitrol van de milieuparkjes (ondergrondse containers in de wijk) hebben wij gezien dat:

- participatiebijeenkomsten van belang zijn voor draagvlak onder inwoners.
- het bepalen van locaties voor ondergrondse containers een tijdrovende activiteit is. Hierbij dient rekening te worden gehouden met o.a. loopafstand, ruimte en de ligging van kabels en leidingen en dat dit flinke vertragingen kan veroorzaken.
- het proces van ingebruikstelling van locaties tijdrovend is in verband met de noodzakelijke aanwijfsbesluiten.
- locatiebesluiten in samen werking met de gemeenten moeten worden bepaald en vastgesteld. Dit zorgt voor meer draagvlak en afstemming binnen de gemeenten en biedt betere juridische waarborging.


Resultaten

Door de goede inzet van inwoners zijn grote stappen gezet om te komen tot een betere scheiding van het huishoudelijk afval.

Afvalscheidingspercentage naar bijna 61%

Door de eerste uitrol in Huizen, Laren en Blaricum (betreft één derde van het totale gebied gedurende drie maanden) is het afvalscheidingspercentage in 2017 gestegen van 54% naar 58%. In het derde kwartaal van 2018 zien we een verdere stijging van het afvalscheidingspercentage naar 61%. Dit is het resultaat van de aanpassingen in fase 1 en de eerste opbrengst van de uitrol van de pmd container in de rest van de regio.

De totale hoeveelheid gescheiden fijn huishoudelijk afval is met ruim 1.580 ton, 4%, toegenomen. De totale hoeveelheid fijn restafval is met bijna 3.330 ton, 9%, afgenomen.

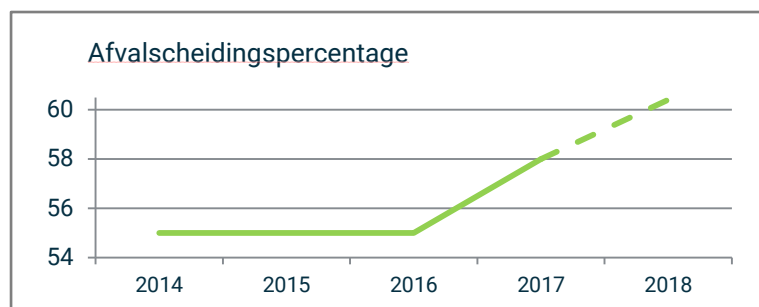

Stijging inzameling pmd

Uit cijfers van het derde kwartaal blijkt dat er een stijging is van 39% aan pmd-inzameling ten opzichte van vorig jaar.

Hoeveelheid restafval gedaald

De verwachting is dat de hoeveelheid restafval 2018 daalt van 222 kg naar 200,7 kg per inwoner per jaar.

Passende inzameling

De aanpassingen naar een passende inzameling per gebiedstype, zoals beschreven in het Uitvoeringsplan, is een jaar later gestart ten opzichte van de planning. Dit komt door verscherping van de regels omtrent het plaatsen van objecten nabij kabels en leidingen. Door de mini containers gelijktijdig uit te rollen is eind 2018 60% van de huishoudens aangesloten op een passend inzamelsysteem.

Inwonertevredenheid

De inwonertevredenheid over de totale dienstverlening is in 2017 iets verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren.

	2013	2015	2016	2017	2018
Tevredenheidscijfer	7	7,4	7,4	7,4	7,6

Investeringen


Onderstaand de begroting van de eenmalige investeringen in het kader van VANG.

Investeringen VANG		
Minicontainers	Aantal	Investering
PMD	59.400	€ 2.100.000
Restafval	80.200	€ 2.400.000
Ondergrondse containers		
Restafval	100	€ 1.200.000
Restafval & grondstoffen	1.500	€ 17.250.000

Ongeveer 29% van de € 22.950.000 aan investering is geactiveerd. Voor de andere onderdelen van het uitvoeringsprogramma zijn benodigde contracten en verplichtingen aangegaan.

Gemeentelijke bijdrage


In het kader van VANG hebben de gemeenten een plafond opgelegd ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage aan de GAD. De hoogte van dit plafond is de gemeentelijke bijdrage van 2015 van € 91,09 per inwoner per jaar. Dit is exclusief de afvalstoffenbelasting en indexering. Voor 2019 wordt er een gemeentelijk bijdrage per inwoner gevraagd van € 88,79 (exclusief verbrandingsbelasting).

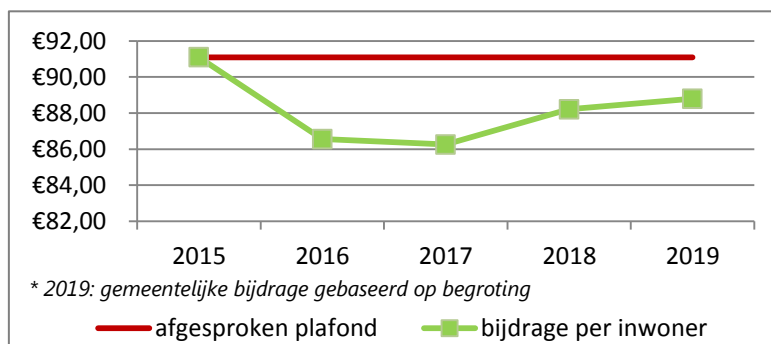

In de afgelopen periode is de gemeentelijke bijdrage licht gestegen en ruim onder het afgesproken plafond gebleven. In het Belastingplan 2019 van de Rijksoverheid is het tarief van de afvalstoffenbelasting verhoogt van € 13,21 naar € 32,12 per 1000 kg voor o.a. het verbranden van restafval. De investeringen voor VANG zullen onder het afgesproken plafond blijven. De verwachting is wel dat door o.a. de stijgende lijn van de afvalstoffenbelasting de gemeentelijke bijdrage gelijk zal blijven of licht zal gaan stijgen.

Prognose ontwikkeling scheidingspercentage huishoudelijk afval

Op basis van bekende afvalcijfers en een doorvertaling van de maatregelen komen we tot de volgende prognose van de ontwikkeling van het afvalscheidingspercentage.

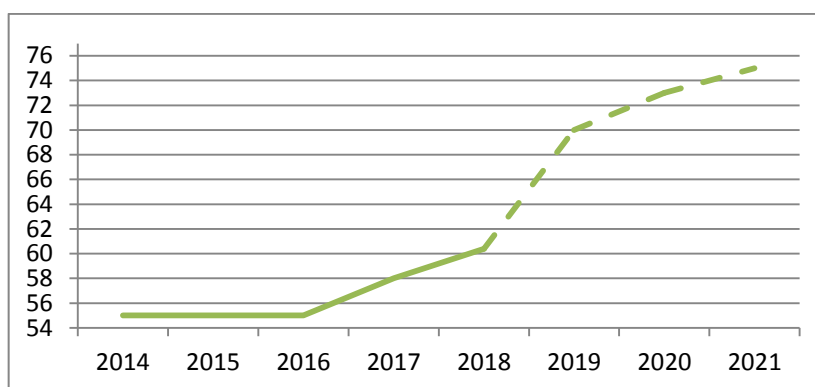

Bijsturen in de uitvoering

Optimalisatie van de inzameling van grondstoffen is een continue proces. Tussentijds vinden er dan ook aanpassing plaats, om bij te sturen. De volgende noemenswaardige aanpassingen vinden de komende periode plaats:

- Op verzoek van inwoners gaan we verder met uitzetten van grote grondstoffen containers 240l ipv. 140l voor gft, papier en karton. Door o.a. meer online aankopen wordt er meer karton ingezameld (dit heeft ook meer volume). Door het aanbieden van een grotere papiercontainer verwachten we dat inwoners beter uitkomen met hun papierinzameling. Tevens zijn er huishoudens die 2 gft containers nu gaan omwisselen voor 1 grotere container. De service en de dienstverlening gaat hiermee omhoog. 1 container neemt minder ruimte in en de kosteneffectiviteit gaat omhoog doordat er 1 container ingezameld hoeft te worden i.p.v. 2.
- Er wordt actief ingezet op vervanging bij onderhoud en plaatsing bij nieuwbouwlocaties. Deze gebieden worden eerder / meteen omgezet naar de nieuwe inzameling.
- Duo-containers: daar waar mogelijk gaan we eerder hoogbouw locaties aansluiten op de duo (pmd/rest) container.
- Voor het centrum van Weesp wordt voorafgaand aan de aanpak van heel Weesp een 'maatwerk' plan geschreven.

Evaluatie & toekomst

In 2019 wordt het uitvoeringplan VANG geëvalueerd. Vervolgens wordt gestart met het maken van de nieuwe kaders voor de periode tot 2025. Dit heeft betrekking op de bredere circulaire economie en gaat daarmee verder dan het verzamelen van huishoudelijk afval. Overwegingen als Diftar (extra tarief op aanbieden restafval), nascheiding, kwaliteit, innovaties en lokale bedrijvigheid maken onderdeel uit van de afwegingen voor de plannen na 2020.
